

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

Evaluación de Informe Técnico

Organización que presenta: Hilfswerk International

Fecha de Presentación: - septiembre de 2021

Fecha de Evaluación:

REF: Entrega OPA Annex 12 Narrative Progress

Período reportado: 01 agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021.

El presente documento constituye la evaluación del informe técnico presentado por la organización Hilfswerk International en cumplimiento de sus obligaciones según el acuerdo suscrito con FAO para el desarrollo del proyecto Amazonia Joven corredores amazónicos para la paz. En el presente informe se recogen cada una de las tareas realizadas e informadas en cada uno de los informes presentados así:

- (Inf. Tri 1) Corresponde al período entre el 22 octubre al 31 de diciembre de 2018
- (Inf. Tri 2) Corresponde al período entre el 31 de enero al 30 de abril de 2019
- (Inf. Tri 3) Corresponde al período entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2019
- (Inf. Tri 4) Corresponde al período entre el 1 de agosto al 31 de octubre de 2019
- (Inf. Tri 5) Corresponde al período entre el 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020.
- (Inf. Tri 6) Corresponde al periodo entre el 1 de febrero de 2020 al 30 de abril de 2020.
- (Inf. Tri 7) Corresponde al periodo entre el 1 de mayo de 2020 al 31 de julio de 2020.
- (Inf. Tri 8) Corresponde al periodo entre el 1 de agosto de 2020 al 30 de octubre de 2020.
- (Inf. Tri 9) Corresponde al periodo entre el 1 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021.
- (Inf. Tri 10) Corresponde al periodo entre el 1 de febrero de 2021 al 30 de abril de 2021.
- (Inf. Tri 11) Corresponde al periodo entre el 1 de mayo de 2021 al 31 de julio de 2021.
- (Inf. Tri 12) Corresponde al periodo entre el 1 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021.

Las tareas están calificadas de la siguiente manera:

- **CUMPLIDA**: cuando la tarea se realizó a cabalidad
- **NO CUMPLIDA**: cuando la tarea no se realizó, quedó incompleta o no tiene la calidad requerida
- **EN DESARROLLO**: cuando la tarea presentada cumple con los requerimientos del proyecto, pero forma parte de un proceso de más largo aliento y que habrá de desarrollarse en el curso del proyecto.
- **POR DESARROLLAR**: cuando la actividad no se ha podido realizar por condiciones externas al proyecto, caso pandemia, por ejemplo, o cuando está programada para un tiempo posterior al de este informe.
- Sin calificación: cuando la acción, siendo necesaria, no se encuentra en el POA.

Al tratarse de un documento consecutivo, que se actualiza a medida que se enriquece con el avance de las actividades en cada uno de los trimestres, algunas actividades ya aparecen cumplidas, las cuales cuentan con sus respectivos anexos o productos requeridos. En este

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

sentido el lector que requiera una mayor información, puede remitirse a los informes de los trimestres anteriores, los cuales reposan en el drive del proyecto Amazonía Joven.

Es necesario aclarar que debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID -19, algunas actividades estipuladas en el proyecto Amazonía joven, no se han podido desarrollar en el tiempo y con las metodologías de reuniones grupales planteadas. Así las cosas, se ha tratado de avanzar de manera virtual, sin embargo, el limitado acceso de internet en las zonas rurales, ha dificultado el avance.

Para una mejor comprensión del informe, se aclara que las actividades con un color de letra azul oscuro (como esta), son aquellas que hacen parte de la adenda firmada, podrían considerarse como la continuación de actividades que ya están en proceso o el desarrollo de nuevas acciones.

R1. Se han creado, con participación de los jóvenes, oportunidades económicas sostenibles e incluyentes, adaptadas al cambio climático, que conservan el bioma amazónico y frenan la expansión agrícola, ganadera y de cultivos de uso ilícito en las Cuencas de los Ríos Guayabero bajo y Guaviare alto y contribuyen a la conservación, uso y manejo sostenible del bosque natural y sus bienes y servicios asociados.

A.1.2. Promoción de negocios verdes promisorios asociados con biocomercio con potencial exportador y alta participación de jóvenes en un marco de promoción global del territorio

A.1.2.1. Levantamiento de la línea base inicial (Identificación de las organizaciones de jóvenes que hay en el territorio).

Se realizó un diagnóstico de las organizaciones juveniles ubicadas en la cuenca alta del río Guaviare y baja del río Guayabero, sin embargo, se pudo identificar que en el territorio hay un bajo proceso de desarrollo organizacional a nivel juvenil, ya que de las seis (6) organizaciones registradas en Cámara y Comercio del municipio de San José, tan solo dos estaban vigentes. Debido a esta situación, se activó la búsqueda a nivel Departamental, logrando identificar tres organizaciones activas y cuya visión se alinea con los negocios verdes, especialmente con el aprovechamiento de los productos no maderables del Bosque.

Este ejercicio permitió identificar una falencia que se viene presentando en el territorio, ya que, el empoderamiento de los jóvenes es bajo, lo que limita el emprendimiento y la creación de empresa, contribuyendo de esta manera a que el campo se siga envejeciendo y los jóvenes se vuelvan dependientes de opciones laborales en los centros urbanos.

En este orden de ideas, el documento de línea base inicial que fue construido de manera articulada con FAO, se encuentra como anexo No 1 del informe correspondiente al trimestre 1.

Esta actividad se considera CUMPLIDA

A.1.2.2. Formulación de los criterios de selección para la identificación de las 3 organizaciones de Jóvenes a Fortalecer.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

En el marco del Comité Técnico establecido entre **FAO y Hilfswerk Internacional** (25 de abril de 2019), conformado por los profesionales Carlos Eduardo Ángel (Profesional especializado ambiental - FAO), Carolina Pinzón (Profesional de seguimiento -FAO), Hans Galeano Fonseca (Profesional especializado de Comercialización - FAO), Paola Andrea Bolaños (Contadora – Hilfswerk) y Juan Carlos Parra (Punto Focal para Hilfswerk del proyecto Amazonía Joven), se hizo un análisis y ajuste a los criterios de selección y a los formatos establecidos para la presentación de las propuestas a financiar. Para la realización de los cambios, se tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por la sede principal de la FAO en Roma y las sugerencias de los miembros del Comité.

Para mayor información en el informe correspondiente al **2 Trimestre** (febrero, marzo, abril de 2019), en los anexos, 1, 2 y 3, se encuentran los formatos y criterios establecidos.

Esta actividad se considera CUMPLIDA

A.1.2.3. Selección de las organizaciones

El mes Marzo del año 2020, se identificaron de manera articulada con FAO, tres (3) organizaciones e igual número de propuestas que estaban bajo la responsabilidad de Hilfswerk Internacional. A continuación, se citan las tres propuestas y organizaciones seleccionadas:

- A. Guaviare joven innovando en Biocomercio de la Cooperativa COMGUAVIARE,** La propuesta se basa en la elaboración de helados y tortas a partir de frutos amazónicos del bosque (Moriche y Asai).
- B. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, socio-organizacionales y financieras de los y las jóvenes del resguardo indígena Asunción, de la Asociación indígena ASOPAMURIMAJSA, Departamento del Guaviare:** La propuesta se basa en la elaboración de salsas picantes, mediante la utilización de los productos de las chagras indígenas tradicionales.
- C. Transformación de Productos Amazónicos,** presentada por la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Calamar Guaviare (**ASOJEC**). La propuesta se basa en la producción de pulpa a partir de los frutales Amazónicos Asai y Seje.

Para mayor información en el informe del trimestre N° 4, se encuentran las propuestas aprobadas de las organizaciones COMGUAVIARE (Anexo 2) y ASOPAMURIMAJSA (Anexo 3).

En el informe del trimestre N° 6, se encuentra la propuesta aprobada de la organización ASOJEC (Anexo 3)

Esta actividad se considera CUMPLIDA

A.1.2.4. Talleres de desarrollo organizacional, en relación con la estructura, gestión y acceso a tecnología.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Se desarrollaron tres (3) jornadas de capacitación con cada una de las organizaciones beneficiadas, los temas fueron priorizados de acuerdo a las necesidades identificadas en las organizaciones y tomando como referencia la experiencia que Hilfswerk Internacional tiene en el componente de Apoyo Financiero a Terceros. En total se desarrollaron nueve (9) talleres, tres (3) por cada organización.

Temas de Capacitación:

1. Conceptualización sobre las figuras organizativas (Asociaciones, Cooperativas, Sociedades Anónimas Simplificadas), estructura organizacional, responsabilidades tributarias, estatutos.
2. Conceptos básicos de contabilidad, construcción de informes financieros (flujo de caja, proyección y presupuesto) y análisis de los estados financieros, retenciones, impuestos.
3. Gestión y acceso a la tecnología, contextualización sobre el sistema de gestión empresarial; que permite a las empresas identificar y controlar todos los procesos según su enfoque económico (ventas finales, compras, área de finanzas, inventarios, promoción, divulgación, mercadeo).

Para mayor información, en el informe del trimestre 5 y 6, se encuentran los anexos de los talleres desarrollados, así como los registros fotográficos.

Esta actividad se considera CUMPLIDA

A.1.2.5. Formalización de las organizaciones en caso de ser necesario

Las organizaciones priorizadas para ser beneficiadas (ASOPAMURIMAJSA, COMGUAVIARE y ASOJEC) ya se encontraban legalmente constituidas, en este sentido no hubo la necesidad de realizar la formalización de las mismas. Como soporte, en los informes de los trimestres 5 y 6, se adjuntó la Cámara y Comercio y los Estatutos de cada organización.

Esta actividad se considera CUMPLIDA

A.1.2.6. Apoyo en la formulación de 3 proyectos, que estén acordes a las características del territorio y alineados con los objetivos del proyecto Amazonía Joven.

La organización Hilfswerk Internacional, dando cumplimiento a las actividades estipuladas en el OPA, apoyó la formulación de tres (3) iniciativas en biocomercio o negocios verdes, acordes a las características del territorio y alineados con los objetivos del proyecto Amazonía Joven:

1. **Guaviare joven innovando en Biocomercio de la Cooperativa COMGUAVIARE.** Firma del convenio y acta de inicio 15 de enero del año 2020. El documento del proyecto aprobado se encuentra como anexo No 2 del informe del trimestre 4.
2. **Fortalecimiento de las capacidades técnicas, socio-organizacionales y financieras de los y las jóvenes del resguardo indígena Asunción, Asociación indígena**

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

ASOPAMURIMAJSA. Firma del convenio y acta de inicio 15 de enero del año 2020. El documento del proyecto aprobado se encuentra como anexo No 3 del informe del trimestre 4.

3. **Transformación de Productos Amazónicos (ASOJEC).** Firma del convenio y acta de inicio 10 de marzo del año 2020. El documento del proyecto aprobado se encuentra como anexo No 3 del informe del trimestre 6.

Esta actividad se considera CUMPLIDA

A.1.2.7. Financiación y acompañamiento de los tres proyectos

Con la liquidación de los tres (3) convenios y la aplicación de la Medición de Emprendimiento Rural (MER), se da por culminado el proceso de acompañamiento técnico, administrativo y financiero. Para mayor información, en el anexo 21 del informe del décimo (10) trimestre, se realiza un resumen del proceso y las lecciones aprendidas, así mismo, en cada uno de los informes trimestrales presentados a FAO, se relacionan anexos y avances de esta actividad.

Convenio	Acta Suspensión		Adenda # 1		Adenda # 2		Adenda # 3		Liquidación
	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	
001- 2020	13-04-20	15-06-20	15-07-20	14-11-20	15-11-20	14-12-20	15-12-20	28-02-21	22-03-21
002 - 2020	13-04-20	15-06-20	15-07-20	14-11-20	15-11-20	14-12-20	15-12-20	28-02-21	29-04-21
004 - 2020			31-10-20	15-12-20	16-12-20	28-02-21			29-04-21

Una vez liquidados los convenios de donación de pequeña cuantía financiados a través de Hilfswerk Internacional, se identificó la necesidad de fortalecer los procesos de comercialización, que permita garantizar una sostenibilidad en el tiempo de los emprendimientos juveniles apoyados. Una necesidad que se evidencia en todas las organizaciones de base apoyadas por el proyecto Amazonía Joven y en las demás asociaciones presentes en el Departamento del Guaviare. En este orden de ideas, a través de FAO se contrató la empresa ASODELEITE, con amplia experiencia en la región, quien fue la encargada de realizar un proceso de fortalecimiento en Marketing territorial, en las 16 organizaciones apoyadas por el proyecto. Dentro de los resultados esperados con este fortalecimiento se destacan:

- Generar capacidades y conocimientos a dos (2) integrantes de cada asociación, que puedan liderar el componente de mercadeo y comercialización, de acuerdo a las exigencias del mercado
- Diseño de logotipos y eslogan para las asociaciones que fueron apoyadas por los convenios de donación de pequeña cuantía (16), los cuales se elaboraran de manera concertada, bajo estándares de calidad e innovación.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

- Una página web con dominio propio por un año, donde cada asociación pueda exponer sus productos a través de las redes.
- Una rueda de negocios virtual, donde se puedan establecer acuerdos comerciales con clientes potenciales.

Al tratarse de una estrategia a nivel de proyecto, se acordó realizar un trabajo articulado en aspectos técnicos y financieros, para lo cual, Hilfswerk Internacional apoyó la financiación de los talleres presenciales, además, de realizar un acompañamiento técnico a través del punto focal y la profesional empresarial.

En este orden de ideas se desarrollaron las siguientes actividades:

1. El día 22 de junio de 2021 se realizó el primer taller presencial con las 16 organizaciones juveniles financiadas por el proyecto, cabe aclarar que, por logística, presupuesto y protocolos de bioseguridad, por cada asociación fueron seleccionados dos (2) jóvenes, quienes son los que participan en los talleres y las personas encargadas del marketing en cada una de sus organizaciones. El tema desarrollado en el primer taller fue **arraigo**. El objetivo de este taller fue obtener información estratégica que las asociaciones tienen acerca de su historia, imagen, cultura, colores, íconos regionales y el tono deseado de comunicación para la marca. Una actividad en donde cada asociación plasmó en una o varias carteleras, algunas imágenes representativas, fotos de su trabajo, palabras claves, íconos, entre otras y así obtener percepciones y lenguaje regional. El taller se realizó en el Municipio de San José durante dos jornadas, en la jornada de la mañana participaron aproximadamente 25 personas y en la jornada de la tarde 20 personas, manteniendo de esta manera un aforo adecuado.




Taller de arraigo ASOJEC



Taller de arraigo COMGUAVIARE

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

2. Con el ánimo de realizar un proceso de seguimiento, análisis y evaluación de la estrategia de Marketing, el día 29 de Junio se desarrolló una reunión virtual en donde participaron delegados de Hilfswerk, FAO y la empresa ASODELEITE, quienes realizaron una exposición de los resultados generados en el marco de los dos primeros talleres desarrollados (brief y arraigo), sin embargo, por parte de Hilfswerk se plantearon algunas interrogantes relacionadas con la metodología y los tiempos de implementación, las cuales se expusieron durante la reunión. Como resultado del ejercicio de seguimiento y evaluación, se llegó a la conclusión, de que es necesario realizar dos (2) talleres más sin costo alguno, uno (1) presencial cuya temática es la introducción al mercadeo y uno (1) virtual, en donde se capacitarán a los jóvenes frente a la estrategia de Marketplace. Así mismo, se acordó que los talleres presenciales deben ser mínimo de un día y para aspectos de seguimiento y evaluación, se realizaran reuniones quincenales en donde participen los socios implementadores y la empresa ASODELEITE.

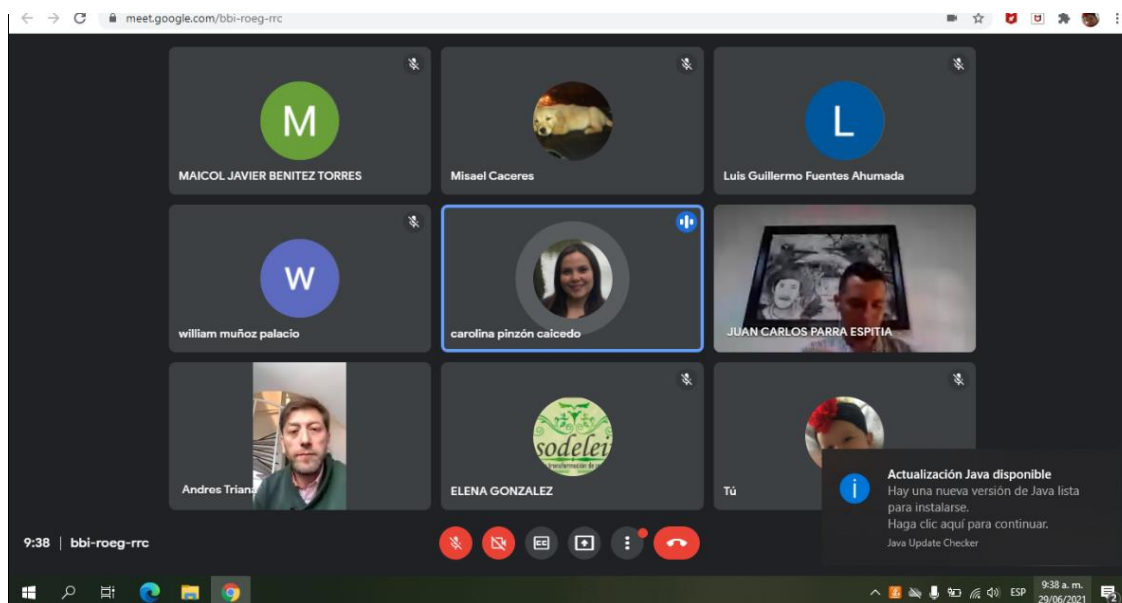

3. El día 22 de Julio en el municipio de San José, se realizó el segundo taller presencial cuyo tema fue “**Mercadeo Rural**”. El marketing rural no es un marketing cualquiera, su fin último, aparte de ayudar a las empresas a que lo utilicen para posicionarse en el mercado, es el de conservar el medio rural. En la mayoría de países occidentales, los habitantes de las regiones menos desarrolladas abandonan su vida para marcharse a la ciudad en búsqueda de una mejor economía, esto favorece la despoblación de estas zonas, poniendo en riesgo su existencia. En este orden de ideas, fortalecer el mercadeo rural a través de iniciativas en biocomercio o negocios verdes, genera alternativas económicas y laborales que incentiva a las nuevas generaciones a quedarse en los territorios. El marketing rural hace todo lo posible para asegurar la continuidad de los pueblos y para ello, se sirve de cualquier técnica conocida y la aplica pensando en la sostenibilidad del medio.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Al encuentro presencial participaron 27 jóvenes, representantes de las 16 asociaciones financiada por el proyecto Amazonía Joven. Los temas desarrollados durante el encuentro fueron: *Aprovechamiento sostenible y sustentable, valor agregado, mercados especializados, cadena de distribución, oferta y demanda, empaque e innovación comercial*. Con el ánimo de aterrizar la terminología ya mencionada, el profesional de ASODELEITE realizó un ejercicio practico con uno de los productos insignias de esta organización denominado “Bananitos liofilizados”, con el cual ejemplificó todo el proceso de análisis del mercado, selección del producto, empaque y la identificación de mercados específicos con alta demanda.



Taller presencial “Mercadeo Rural”

4. Con el ánimo de conocer las capacidades de las asociaciones en relación a la producción y estándares de calidad de los productos generados (pulpas, salsas, ají, galletas), el día 23 de Julio se realizó una visita de seguimiento a la planta de transformación de las asociaciones ASOJEC y ASOPAMURIMAJSA. El recorrido estuvo acompañado por los profesionales de ASODELEITE y los miembros de la junta directiva de las asociaciones, quienes expusieron la cadena de producción, que inician en la selección y recolección de la materia prima, hasta llegar al empaque y distribución del producto en los puntos de comercialización.



Visita de seguimiento ASOPAMURIMAJSA

Visita de seguimiento ASOJEC

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Informe No 12.

5. El día 13 de agosto, se apoyó logística y económicamente el desarrollo del tercer (3) taller presencial, dictado por Andrés Triana Pulido representante de la organización ASODELEITE. El taller se enfocó en la identificación de los diferentes tipos de mercados, canales de distribución, publicidad y el uso de plataformas virtuales que permitan innovar a la hora de presentar los productos y comercializarlos. Es necesario mencionar que, el proyecto Amazonía Joven contrato con ASODELEITE, la apertura de una pagina web y los dominios, con vigencia de un (1) año para cada organización, que permitan a las asociaciones juveniles explorar las plataformas virtuales para el desarrollo del marketing. Del mismo modo y teniendo en cuenta que se trataba del último taller presencial, cada organización con el apoyo de ASODELEITE, definido la marca bajo la cual comercializaran cada uno de sus productos o servicios.

Al taller asistieron 24 personas de las 16 organizaciones beneficiadas por el proyecto en el Departamento del Guaviare.

ítem	Nombre Organización	Marca Seleccionada
1	ASOCAÑACOL	Panela Guaviare
3	ASOCAÑODORADO	Huerto Dorado
4	ASOFAZ	Frutos la Lindosa
5	ASOMUSEPAZ	Carnes La Esperanza
6	ASOJEC	Selvatika
7	ASOMUJAPAL	HLC
8	ASOPAMURIMAJSA	Tukano
09	ASOPROCACAO	Asoprocacao
10	ASOPRODESG	Panela Mirolindo
11	CAMPO GUAVIARE	MAB
12	COMGUAVIARE	Del Bosque
13	SACHA CALAMAR	Selva Dulce
14	DIGITAL COBOSQUES	Pepe-Quida
15	ASOJOTER	Asojoter
16	COOJAPAL	El Tamaro

Anexo 1. Listado de asistencia del 3 taller presencial.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Registro fotográfico tercer taller presencia, mercadeo y ruralidad


6. Teniendo en cuenta que uno de los productos acordados con la organización ASODELEITE mediante carta de acuerdo, fue el desarrollo de una rueda de negocios virtual, que permitiera a las asociaciones juveniles exponer sus productos y servicios e identificar mercados potenciales, durante el mes de agosto se estructuró entre ASODELEITE, FAO y Hilfswerk, un cronograma de reuniones virtuales en donde los delegados de reconocidas empresas regionales, interactuaron con los representantes de las asociaciones, logrando de esta manera incursionar en mercados con Departamentos vecinos y centro del País (Villavicencio – Bogotá).

A continuación, se relaciona el cronograma estructurado para las organizaciones ASOJEC, ASOPAMURIMAJSA y COMGUAVIARE, cuyas reuniones contaron con el acompañamiento de los profesionales de Hilfswerk.

CLIENTE	CATEGORIA	CANAL	CONTACTO	FECHA	HORA	TIEMPO	ASOCIACIONES	MARCA
CONYLAC	LACTEOS	Mayorista	Camilo de la Cruz	23/08/2021	15:00	30 mins.	ASOJEC	SELVATIKA
FANCY FOOD PAELLAS	ALIMENTOS Y BEBIDAS	HORECAS	BRAYAN MENDEZ	23/08/2021	16:00	30 mins.	ASOPAMURIMAJSA	TUKANO
ABBATA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	HORECAS	JUAN CAMILO	23/08/2021	17:00	20 mins	ASOPAMURIMAJSA	TUKANO
T&A - dearraigo	Productos de origen y	Distribuidor minorista	Daniel Triana	24/08/2021			ASOPAMURIMAJSA	TUKANO
Baked by Ana	Panaderia & Pasteleria	Minorista	Mauricio Jara	25/08/2021	8:00	30 mins	COMGUAVIARE	DEL BOSQUE
HATOGRADE	Alimentos y bebidas (compras institucionales)	HORECAS	Pedro Bernal	25/08/2021	9:00	20 mins	COMGUAVIARE	DEL BOSQUE
						20 mins	ASOPAMURIMAJSA	TUKANO
PEPAS & GRANOS	Abarrotes	Distribuidor minorista	Juan Carlos Pardo	25/08/2021	10:00	20 mins	ASOPAMURIMAJSA	TUKANO
						20 mins	ASOJEC	SELVATIKA

Acompañamiento ruedas de negocios virtuales.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

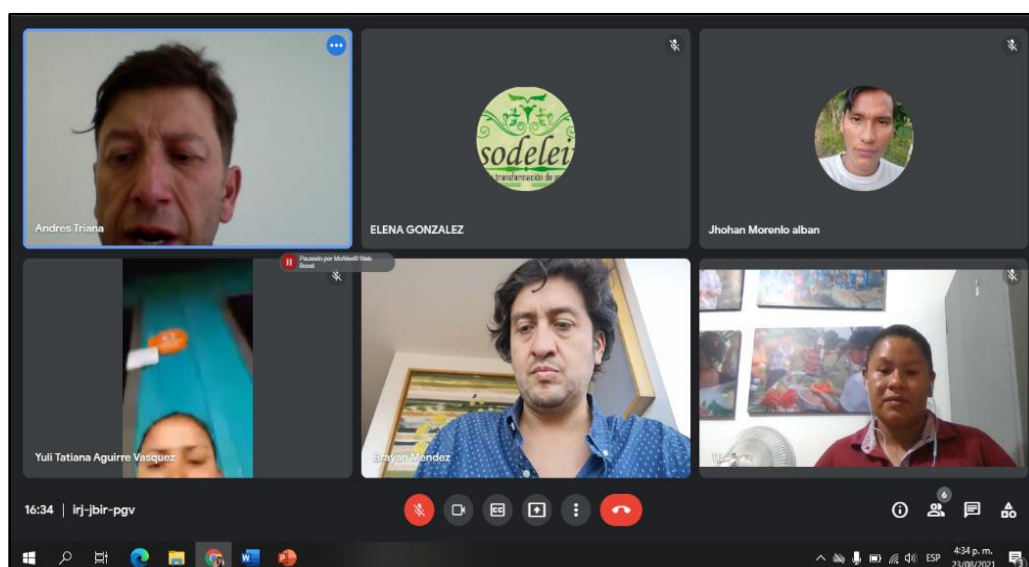

7. Acompañamiento a los encuentros virtuales de marketing territorial, desarrollados con la organización ASODELEITE, en donde se hizo una evaluación de las propuestas de marca y eslogan presentadas a las tres asociaciones financiadas a través de Hilfswerk. Hubo gran aceptación de la propuesta presentada a las organizaciones ASOPAMURIMAJSA y ASOJEC, ya que, representa toda la pluriculturalidad que hay en el territorio y la riqueza ambiental que provee a los jóvenes de los productos no maderables del bosque. En el caso del diseño de marca y eslogan presentada a la cooperativa COMGUAVIARE, se solicitó hacer unos ajustes de forma, relacionados con el color y las imágenes que aparecen en la marca, ya que los jóvenes de la organización no se sintieron identificados.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

	
Marca aprobada por ASOPAMURIMAJSA	Marca aprobada por ASOJEC

	
 Propuestas por definir COMGUAVIARE	

Con el acompañamiento técnico y financiero desarrollado por Hilfswerk durante el mes de agosto, se da por culminada esta actividad.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.2.8. Evaluación e informe final

En el anexo 21 del informe del trimestre número 10, se encuentra el informe final.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

A.1.2.9 Fortalecimiento de capacidades- componente ambiental. Realización de un Taller de Capacitación en Recursos no Maderables del Bosque.

En un proceso articulado con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria **AGROSAVIA**, durante los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2020, se realizó una jornada de capacitación teórico-práctica, alrededor de los productos no maderables del bosque, la cual tenía por objetivo, generar una transferencia de tecnología a las organizaciones juveniles que son financiada a través de convenios de donación de pequeña cuantía, cuyas apuestas productivas se enfoca en el aprovechamiento de palmas amazónicas (Asaí, Seje y Moriche).

Para mayor información, en el informe técnico correspondiente al octavo (8) trimestre, se encuentra la descripción de los talleres, así como los anexos respectivos (Anexo 22 y 23).

Esta actividad se considera **CUMPLIDA**

A.1.4. Desarrollo en finca y en centros poblados de módulos de producción agropecuaria (hortalizas, frutales, especies menores) para el autoabastecimiento, la mejora de la calidad de vida, la venta de excedentes a mercados locales y la resiliencia comunitaria- FIFAS (Fincas Integrales, Familiares, Autosostenibles)

A.1.4.1. Caracterización de la zona geográfica objeto del proyecto (Uso y aptitud de los suelos, figuras de protección legal o ambiental, características edafoclimáticas, vías).

El documento de las características de la zona geográfica a intervenir, que describe las condiciones climáticas, de zonificación y uso de suelos, se encuentra como anexo en el informe técnico correspondiente al 2 trimestre.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.4.2. Construcción Línea base inicial de los resguardos y comunidades a intervenir. (Social, ambiental, económica, productiva)

El documento de línea base inicial, se construyó de manera articulada con el socio implementador FAO, para lo cual, Hilfswerk Internacional mediante la herramienta Koobo, recopiló la información de campo en los Resguardos Indígenas Asunción y Caño Negro. Para mayor información en el informe técnico correspondiente al trimestre 2, se encuentran los anexos.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.4.3. Definición y sistematización de los componentes de una chagra indígena tradicional (entrevistas con sabedores, chagreros y ancianos, encuentros interculturales, conversatorios)

Como parte del componente de gestión de conocimiento del proyecto Amazonía Joven, se construyó de manera participativa con chagreros y sabedores de las comunidades indígenas Sikuani, un documento en el que se detallan las características y componentes de la Chagra

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

tradicional. Para mayor información, el documento se encuentra como anexo 15, en el informe técnico del trimestre 2.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.4.4 Implementación de 30 Chagras indígenas tradicionales, 15 en los resguardos Cachiberas de Nare y Caño Negro y 15 en los resguardos Barranco Colorado y Barranco Ceiba.

Se implementaron un total de 38 Chagras indígenas tradicionales, 25 en el Resguardo Indígena Caño Negro y 13 en el Resguardo Indígena la Asunción, sin embargo, las inundaciones causadas por el invierno del año 2019 en el Resguardo Caño Negro, generaron pérdida total en 3 Chagras, quedando un consolidado de 35 Chagras.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.4.5. Identificación y consolidación de 5 de rutas integrales de alimentación, donde la comunidad indígena Nukak Meomuno de la vereda Charras, desarrolle sus prácticas alimenticias basadas en la economía seminómada.

Durante el año 2019 se desarrollaron cinco (5) Rutas de caza, pesca y recolección, con el grupo territorial Meomuno Nukak ubicado en el asentamiento la Esperanza de la vereda Charras.

- ✓ Ruta N° 1 **Laguna Cielo**, desarrollada del 28 de febrero al 4 de marzo de 2019.
- ✓ Ruta N° 2 **Caño Danta**, desarrollada del 6 al 9 de abril del año 2019.
- ✓ Ruta N° 3 **Wanna**, desarrollada del 25 de mayo al 5 de junio de 2019.
- ✓ Ruta N° 4 **Caño Rojo**, desarrollada del 19 al 24 de Julio de 2019.
- ✓ Ruta N° 5 **Chipiaimbe**, desarrollada del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2019.

Para mayor información, en el anexo 18 del informe correspondiente al 5 trimestre, se encuentra el informe final que compila la información de las rutas desarrolladas.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.4.6. Desarrollo de 4 encuentros interculturales de intercambio de semillas entre los indígenas Sikuani, Jiw, Tucano y Nukak.

A.1.4.1. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y desarrollo de procesos de intercambio local mediante 2 encuentros interculturales de intercambio de semilla entre los indígenas Excombatientes de los ETCR Charras y Colinas, Campesinos e indígenas de la familia lingüística Tucano.

Esta actividad que en el POA de la Prórroga aparece como Actividad 1.4.1, busca dar continuidad a los encuentros interculturales de intercambio de semilla, esta vez con una mayor participación de Población en Proceso de Reincorporación, así las cosas, se plantea el desarrollo de dos (2) encuentros, uno de ellos que estaba pendiente de la actividad A.1.4.6.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

En el informe del trimestre número 10, en la actividad **A .1.4.1**, paginas 15,16,17,18,19 y 20, se encuentra una descripción de los dos encuentros realizados y los anexos que respaldan el desarrollo de los mismos, corresponden al anexo No 22 y 23.

Dentro de los principales resultados generados en los encuentros de intercambio de semillas se destacan:

- Generar un intercambio de conocimiento alrededor de los modelos de producción campesina, indígenas chagreros e indígenas recolectores.
- Reconocer el uso y manejo de las semillas en los modelos productivos de las diferentes culturas participantes.
- Identificar prácticas sostenibles e innovadoras en los modelos de producción agrícola.
- Promover acuerdos alrededor de los componentes de: seguridad alimentaria, territorio y medio ambiente, paz, innovación comunitaria y cultura.
- El aprendizaje intercultural alrededor de las semillas propias y de los modelos de producción agrícola, demuestra un afianzamiento local en medio de la globalización, promoviendo un proceso paulatino de custodio de semillas, valoración y defensa de la cultura, el medio ambiente y sus recursos naturales..

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.1.4.7. Desarrollo de 4 ferias gastronómicas interculturales, donde colonos e indígenas intercambien conocimientos y prácticas alrededor de sus sistemas productivos y de transformación de alimentos.

Se dio cumplimiento a la actividad, mediante el desarrollo de Cuatro encuentros gastronómicos interculturales en los siguientes lugares:

1. **“PRIMER ENCUENTRO INTERCULTURAL ALREDEDOR DE LA GASTRONOMÍA Y LA MEMORIA “EL FOGÓN DEL CONOCIMIENTO”**, desarrollado el día 14 de diciembre de 2018 en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Marco Aurelio Buendía, de la vereda Charras.
2. **SEGUNDO ENCUENTRO INTERCULTURAL ALREDEDOR DE LA GASTRONOMÍA Y LA MEMORIA ORAL**, desarrollado el día 27 de abril de 2019 en el Resguardo Indígena la Asunción.
3. **TERCER ENCUENTRO GASTRONÓMICO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CHARRAS, CONMEMORACIÓN DE LA AFROCOLOMBIANIDAD**, desarrollado el día 24 de mayo de 2019 en la Institución educativa Charras.
4. **CUARTA FERIA GASTRONOMICA INTERCULTURAL DE SABERES Y SABORES 2019**, desarrollada el 17 de agosto de 2019 en el Municipio de San José.

Para mayor información remitirse al anexo 19 del informe técnico correspondiente al 6 trimestre.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

A.1.4.2. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y desarrollo de procesos de intercambio local mediante la realización de 1 feria gastronómica intercultural, entre los indígenas Excombatientes de los ETCR Charras y Colinas, Campesinos e indígenas de la familia lingüística Tucano.

En el informe del trimestre número 10, en la actividad A.1.4.2, páginas 21,22 y 23, se describe el desarrollo de la feria gastronómica, desarrollada de manera articulada con el socio implementador FAO, de la cual, vale la pena aclarar, se tomaron valiosos insumos para el desarrollo de la actividad denominada “*memoria histórica de la gastronomía*”. En el anexo 24 del informe del décimo trimestre, se encuentra el listado de asistencia de la feria gastronómica.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.4.8. Identificación, sistematización y fortalecimiento de 3 innovaciones comunitarias de los pueblos indígenas, alrededor de prácticas saludables y autonomía alimentaria.

Se identificaron y sistematizaron tres (3) innovaciones comunitarias de los pueblos indígenas, alrededor de prácticas saludables y autonomía alimentaria.

1. **Nombre de la Innovación:** *Fariña de Chontaduro (trepoka) un complemento alimenticio acorde a las tradiciones indígenas y a la oferta del medio.*
2. **Nombre de la Innovación:** *Pescado pilado (vahai dokegue- vahai tokaa).*
3. **Nombre de la Innovación:** *Restauración ecológica integral a partir de saberes indígenas Nukak.*

Para mayor información, en los anexos 19 y 20 del informe técnico correspondiente al 5 trimestre, se encuentran los documentos de sistematización de las dos primeras innovaciones, mientras que en el anexo 20 del informe técnico correspondiente al 6 trimestre, se encuentra el documento de sistematización de la tercera Innovación.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.4.9. Desarrollo de procesos de gestión de conocimiento alrededor de los modelos productivos de los pueblos indígenas.

A lo largo del proyecto se sistematizaron diferentes documentos que representan el conocimiento y el trabajo desarrollado, dicha información ha sido compartida con las comunidades beneficiarias, teniendo en cuenta que les permite conservar parte de su historia.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.1.4.10. Acompañamiento y seguimiento a la línea de chagras

Las acciones de acompañamiento y seguimiento planteadas en esta actividad, se cumplieron según lo proyectado, sin embargo y teniendo en cuenta la continuidad del proyecto hasta el mes

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

de diciembre de 2020, en el POA de la prórroga se dejó como tarea un seguimiento mensual a los resguardos Caño Negro y Asunción.

A.1.4.3. Fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional mediante 6 visitas de acompañamiento y seguimiento a la línea de chagras de los resguardos Caño Negro y la Asunción.

Para el cumplimiento de esta actividad y el desarrollo de todo el componente étnico incluido el trabajo con población en proceso de reincorporación indígena, se contrató a un antropólogo y un técnico de campo, quienes fueron vinculados laboralmente desde el día 1 de Julio de 2020 hasta el mes de enero del año 2021. El objetivo de estos profesionales fue realizar seguimiento técnico en los Resguardos indígenas Asunción y Caño Negro, donde de manera previa, se habían implementado 35 chagras tradicionales. Aunque se tenía como meta desarrollar un mínimo de seis (6) visitas, finalmente se realizaron más de veinticinco (25) visitas de acompañamiento. El detalle de cada visita al igual que los listados de asistencia, se encuentran detallados en los informes trimestrales 8 y 9.

Dentro de los resultados generados con esta acción se destacan:

1. La implementación de 35 Chagras Indígenas Tradicionales, como parte del proceso de revitalización cultural de los pueblos indígenas, de las cuales, 22 se implementaron el Resguardo Caño Negro y 23 en el Resguardo Asunción.
2. Recuperación, multiplicación y propagación de germoplasma (tradicional), que se había perdido, debido a la introducción de modelos productivos ajenos a la cultura indígena. Para esto, el proyecto Amazonía Joven, adquirió en el departamento del Vaupés, 8 variedades de yuca brava y 20 variedades de ají, que fueron repartidos en los Resguardos Asunción y Caño Negro, convirtiéndolos en custodios de semillas.
3. Se logró una mayor participación de los jóvenes en la siembra y mantenimiento de las Chagras, posicionando estas unidades productivas como espacios de aprendizaje (aulas vivas), donde la lengua, la medicina tradicional, los rezos y los calendarios agroecológicos, son puestos en prácticas y hacen parte de una formación para la vida.
4. Se aumento la disponibilidad de alimentos a nivel de núcleo familiar en calidad y variedad, fortaleciendo de esta manera la seguridad y autonomía alimentaria, especialmente en tiempos de COVID 19. Lo que le permitió a los Resguardo Asunción y Caño Negro, cerrar sus puertas por más de 6 meses, garantizando una autonomía alimentaria a su comunidad.
5. Gracias a las visitas de seguimiento, se lograron desarrollar talleres de introducción a la agroecología, donde se abordaron técnicas para la preparación de abonos orgánicos, coberturas vegetales, asociación de cultivos, entre otros, con el fin de mejorar las características de las unidades productivas y de los suelos, dado que, al

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

aumentar la densidad de población en cada resguardo, existe una mayor presión sobre el suelo.

6. La semilla entregada a finales de 2018 y principios de 2019, destinada para el establecimiento de 35 Chagras, se constituyó como un capital semilla y permitió que se establecieran más de 70 Chagras nuevas, ya que la cultura de los pueblos indígenas es escalonar la producción de alimentos, mediante el establecimiento anual de una chagra. En este sentido, las chagras establecidas por el proyecto Amazonía Joven durante el año 2018 y 2019, proporcionaron germoplasma para el establecimiento de las chagras familiares correspondientes a los años 2020 y 2021.
7. El acompañamiento del equipo técnico del proyecto Amazonía Joven, permitió generar confianza con los beneficiarios, a tal punto, que se logró la sistematización de algunos procesos de innovación comunitaria y los modelos de producción propia, insumos que permiten a las entidades tener una mayor comprensión de la cultura indígena y en el caso de las comunidades, conservar sus conocimientos y tradiciones de una manera escrita.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**

A.1.4.4. Desarrollo de dos (2) talleres alrededor de hábitos de vida saludables y prácticas de transformación y conservación de alimentos, para el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional

Aunque la presente actividad contemplaba el desarrollo de dos (2) talleres, alrededor de hábitos de vida saludables y prácticas de transformación y conservación de alimentos, teniendo en cuenta las necesidades identificadas con las comunidades indígenas, se elaboró un plan de capacitación y se desarrollaron cuatro (4) talleres en los Resguardos Asunción, Caño Negro y los ETCR Charras y Colinas, para un total de 16 talleres desarrollados. El plan de capacitación se encuentra en el anexo 31 del informe correspondiente al trimestre No 8 y el detalle de cada uno de los talleres desarrollados se encuentra en el informe técnico correspondiente al trimestre No 9.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**

A.1.4.11. Realización de Línea base final.

Los documentos que respaldan el desarrollo de esta actividad, se encuentran como anexo No 22 y 23 del informe técnico correspondiente al 9 trimestre.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**

A.1.4.12. Realización de Evaluación e informe final

Para mayor información en el anexo 25 del informe del décimo (10) trimestre, se anexa un documento en el que se hace una evaluación y se detallan los resultados generados por el

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

proyecto Amazonía Joven, en el marco del fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas Nukak, Sikuani y Tucano.

Esta acción se considera CUMPLIDA

R2. Las comunidades, y en particular los jóvenes, han desarrollado capacidades que les permiten liderar y participar en una gestión sostenible e innovadora del asentamiento humano en las cuencas de los Ríos Guaviare alto y Guayabero bajo con el enfoque de construcción de paz, innovación territorial e identidad cultural

A.2.1. Mejoramiento del acceso, calidad y pertinencia educativa, así como del acceso a Tics de las comunidades educativas en las cuencas.

A.2.1.1. Realizar actividades de capacitación para lograr la alfabetización digital, asegurando el acceso a las TIC's para cuatro (4) instituciones educativas.

El proyecto Amazonía Joven, garantiza el suministro de internet hasta el 31 de julio del año 2021, en 6 Instituciones Educativas, 1 Resguardo Indígena, 2 casetas de Junta de Acción Comunal y 2 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, que les permita a las comunidades indígenas, campesinos y excombatientes, garantizar el acceso a las Tics, complementar los procesos de formación en tiempos de pandemia y tener una mayor comunicación con el mundo.

A continuación, se relaciona una tabla en la que se detalla los sitios y las fechas de instalación del servicio.

ITEM	UBICACIÓN	FECHA DE INICIO DEL SERVICIO	FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO
1	Institución Educativa Charras	01/09/2019	31/07/2021
2	Institución Educativa Puerto Nare	01/10/2019	31/07/2021
3	Institución Educativa Colinas.	01/08/2019	31/12/2020
4	Institución Educativa Caracoles	01/08/2019	31/07/2021
5	Institución Educativa La Carpa	15/10/2019	31/07/2021
6	Institución Educativa Cerro Azul	01/10/2019	31/12/2020
7	ETCR Charras	03/02/2020	31/07/2021
8	ETCR Colinas.	05/02/2020	31/07/2021
9	Resguardo ASUNCIÓN	20/11/2020	31/07/2021
10	Caseta Junta de Acción comunal Alpes	09/12/2020	31/07/2021
11	Caseta Junta de Acción Comunal Orquídeas	13/11/2020	31/07/2021

Como parte del proceso de Mejoramiento y acceso a Tics de las Instituciones Educativas en las que se desarrolló la formación en alfabetización digital, el proyecto Amazonía Joven realizó la dotación de computadores portátiles y Tablets, en aquellos centros educativos donde no existía la capacidad instalada, es de anotar que la distribución de los equipos se desarrolló de una manera articulada con la secretaría de Educación Municipal y Departamental, de tal manera, que

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

lejos de duplicarse las acciones, se complementen y pueda beneficiarse un mayor número de jóvenes. En total se entregaron 24 equipos portátiles con sus respectivos programas y 14 tablets.

INSTITUCION EDUCATIVA	PORTATILES ENTREGADOS	TABLETS ENTREGADAS
COLINAS	4	2
CHARRAS	0	2
CARACOL	4	2
LA CARPA	4	2
CERRO AZUL	0	2
CERRITOS	4	1
ETCR COLINAS	3	1
NUEVA GENERACIÓN COLINAS	2	1
ETCR CHARRAS	3	1
TOTAL	24	14

Para mayor información, en el anexo 24 del informe técnico correspondiente al 6 Trimestre, se encuentran las actas de entrega de los equipos de cómputo.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.2.1.1. Capacitaciones para lograr la alfabetización digital de la comunidad educativa, asegurando el acceso a las TIC's en las Instituciones Educativas Colinas, Caracoles, Carpa, Cerro Azul, Nare y Charras.

Desde el mes de septiembre del año 2019 y hasta mediados de marzo del año 2020, se desarrolló un proceso de formación en alfabetización digital, en las Instituciones Educativas Colinas, Caracoles, Carpa, Cerro Azul, Nare, Charras y Cerritos, beneficiando a 349 jóvenes entre los 14 y 29 años, sin embargo, debido al confinamiento y receso escolar emitido por el Gobierno Nacional debido al COVID 19, el proceso de alfabetización tuvo que ser culminado.

Del mismo modo y con el ánimo de generar capacidades en TICs, en los jóvenes de las asociaciones juveniles que hacen parte del componente de apoyo financiero a terceros, se realizaron tres talleres de formación, capacitando un total de 41 jóvenes.

INSTITUCIÓN EDUCATIVAS	MUJERES	HOMBRES	INDIGENA	AFRO	EXCOMBATIENTE	JOVENES
LA CARPA	35	40	4	7	0	75
CERRO AZUL	12	15	4	3	0	27
COLINAS	19	18	3	4	5	37
CERRITOS	26	26	0	2	0	52
NARE	16	14	17	3	0	30
CARACOL	33	40	0	5		73

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

CHARRAS	25	30	5	8		55
COMGUAVIARE	5	7	0	0		12
ASOJEC	3	11		1		14
ASOPAMURIMAJSA	9	6	15			15
TOTAL						390

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.1.2. Identificación y caracterización de los cuatro (4) Centros educativos, donde se van a desarrollar las acciones.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.1.4. Conformación y capacitación del equipo impulsor del modelo escuela vereda innovadora (padres, alumnos, docentes, JAC, Institucionalidad).

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.1.5. Desarrollo y adaptación de metodologías y herramientas, para el involucramiento de los estudiantes y comunidades indígenas.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.1.6. Implementación de actividades a nivel de Aula (preparación y ejecución)

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.1.7. Implementación de actividades a nivel de centro educativo.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.1.8. Implementación de actividades a nivel de vereda

Las Experiencias Pedagógicas Significativas (EPS) desarrolladas en el marco del proyecto Amazonía Joven a nivel de aula, centro educativo y vereda fueron las siguientes:

- **Cine Foro Comunitario.**
- **Las fuentes hídricas perduran.**
- **Las medidas de mi territorio.**
- **Memorias históricas “reconociendo y construyendo la historia de mi vereda”.**

En el informe del Sexto Trimestre se relacionaron los Anexos 26, 27, 28, 29 y 30, los cuales corresponden a un informe general de las experiencias desarrolladas y los documentos descriptivos y metodológicos de cada experiencia (cine comunitario, las fuentes hídricas perduran, memorias históricas y medidas de mi territorio).

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

Esta acción se considera **CUMPLIDA**

A. 2.1.2. Fortalecimiento al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), en las Instituciones Educativas Cerro Azul, Colinas, La Carpa, Caracoles y Puerto Nare, mediante 10 jornadas de trabajo.

Para mayor información sobre el desarrollo de esta actividad, remitirse al informe técnico correspondiente al 8 trimestre y a los anexos 34,35,36,37,38 y 39 del mismo informe.

Esta acción se considera **CUMPLIDA.**

R. 2.2 Construcción de capital social (con énfasis jóvenes) para la sostenibilidad y la paz a partir del desarrollo de capacidades en organizaciones comunitarias y la movilización e integración social a través del arte, el deporte y la comunicación.

A.2.2.1. Aplicación del diagnóstico veredal participativo en aspectos ambientales, sociales, productivos y económicos.

En cada uno de los documentos (Planes veredales), se encuentran los diagnósticos de las veredas.

Esta acción se considera **CUMPLIDA.**

A.2.2.2. Diseño participativo de cuatro (4) planes veredales con sus respectivos planes operativos y estrategias de implementación.

Esta actividad se considera Cumplida, teniendo en cuenta que se sistematizaron y entregaron cuatro (4) Planes veredales:

1. **Plan veredal Charras.** Anexo 23 Informe técnico 7 Trimestre.
2. **Plan veredal Caracoles.** Anexo 42 Informe técnico 8 Trimestre.
3. **Plan veredal Puerto Nare.** Anexo 43 Informe técnico 8 Trimestre.
4. **Plan veredal Carpa.** Anexo 24 Informe técnico 9 Trimestre.

Esta acción se considera **CUMPLIDA.**

A.2.2.1. Seguimiento y acompañamiento a la actualización e implementación de cuatro (4) Planes Veredales (Carpa, Caracoles, Puerto Nare y Charras), dando prioridad a las acciones enmarcadas en el componente ambiental.

Como parte del proceso de acompañamiento y actualización de los Planes Veredales, se realizó la entrega formal de los documentos finales, a la Junta de acción comunal de las veredas Charras, Puerto Nare, Caracoles y Carpa, de tal manera, que puedan utilizar dicha herramienta para gestionar su desarrollo, convirtiéndose en un documento dinámico que se actualiza y se evalúa, de acuerdo al avance de las estrategias allí planteadas.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

- El día 14 de diciembre de 2020, se realizó la entrega Formal del Plan Veredal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Puerto Nare.
- El día 16 de diciembre de 2020, se realizó la entrega Formal del Plan Veredal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Caracoles.
- El día 17 de diciembre de 2020, se realizó la entrega Formal del Plan Veredal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Charras.
- El día 11 de marzo de 2021, se realizó la entrega Formal del Plan Veredal a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Carpa.



De manera formal y como estrategia de salida y articulación interinstitucional, se entregaron a la Gobernación del Guaviare cuatro (4) planes veredales correspondientes a las comunidades **Charras, Carpa, Caracoles y Puerto Nare**, con el fin, de que a través de la Secretaría de Gobierno y de Planeación Departamental, se pueda gestionar su implementación de acuerdo a las necesidades particulares del territorio. La entrega se realizó de manera física al secretario de Gobierno Dr. Edwin Useche, a la Secretaria de Planeación (E) Dra. Nubia Estela Holguín López y al profesional de Planta de la secretaria de Planeación, quien es el encargado del ecosistema de competitividad e innovación Dr. Ezequiel Barragán.

Es necesario mencionar que, a nivel normativo, los planes veredales se encuentran sustentados en la Constitución Política de 1991, que define a Colombia como un Estado Social de Derecho (Art. 1 C.N.) y con el Artículo 350, que establece que todo Plan de Desarrollo y todo presupuesto dará prioridad al gasto público social, diseñará políticas, programas y proyectos que atiendan al conjunto de derechos económicos, sociales y colectivos de la población del municipio.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.**

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

Posteriormente, la Ley 1551 de 2012 en el Artículo 6, Parágrafo 1°, menciona: “Las políticas, planes, programas y proyectos con destino al fortalecimiento de los cabildos, de las autoridades y organizaciones indígenas y de los organismos de acción comunal, se formularán en concertación con ellas”. El Artículo 6, que define la función de los municipios, en el numeral 2, estipula *“Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población”*



Reunión de socialización y entrega de los Planes Veredales a la Gobernación del Guaviare.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.2.3. Implementación de acciones y estrategias priorizadas en los planes veredales, para mejorar la calidad de vida de las familias de manera sostenible.

Las acciones o actividades desarrolladas por el proyecto Amazonía Joven, constituyen solo una parte de las necesidades estipuladas en los planes veredales, el detalle de estas, según las propuestas hechas por la comunidad, se estipulan en el marco de los documentos, exactamente en el Capítulo N° 9 “Avances en la ejecución del Plan”.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.2.4. Realización de ciclo de capacitación a profesores, estudiantes y líderes comunitarios, sobre la innovación comunitaria, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

En articulación con SENA regional Guaviare, se llevó a cabo el ciclo de capacitaciones a población campesina, estudiantes, docentes e indígenas; *sobre Emprendimiento, Desarrollo Organizacional e Innovación comunitaria*, teniendo en cuenta, las necesidades identificadas en las organizaciones juveniles del territorio. Con respecto al desarrollo organizacional y la formalización de sus figuras asociativas, los temas desarrollados durante las capacitaciones fueron los siguientes: Empresarismo e innovación, figuras organizativas y requisitos, creación y apoyo empresarial con fondo emprender, metodología DOFA.

Las capacitaciones fueron realizadas en las siguientes fechas y en los siguientes lugares:

- ✓ Lunes 16 de septiembre Vereda Las Colinas.
- ✓ Martes 17 de septiembre, Vereda Caracol.
- ✓ Miércoles 18 de septiembre, Vereda Cerro Azul.
- ✓ Miércoles 18 de septiembre, Vereda La Carpa.
- ✓ Lunes 23 de septiembre, Vereda Charras.
- ✓ Miércoles 25 de septiembre, Vereda Puerto Nare.

Para mayor información sobre el desarrollo de esta actividad, buscar en los anexos 36,37,38,39,40 y 41 del informe técnico correspondiente al cuarto (4) trimestre.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.2.2.5. Realización del plan e implementación de medidas de fortalecimiento y/o desarrollo de Innovaciones Comunitarias identificadas o por desarrollar.

En el desarrollo de esta actividad, se identificaron y sistematizaron dos (2) innovaciones comunitarias, la primera de ellas obedece a una innovación pedagógica denominada **Guaviare verde-Guaviare sobre ruedas**, La cual se basa en el reciclaje de las llantas de vehículos que han sido abandonadas a nivel veredal o interveredal, para la elaboración de figuras decorativas o elementos como materas y canecas de basura. La segunda Innovación se denominada “**Vinos artesanales, una alternativa económica que fortalece el turismo en la vereda Cerro Azul**”, en donde se detalla una iniciativa campesina, que busca aprovechar los frutales de su finca y generar un valor agregado, mediante la preparación y comercialización de vinos artesanales.

Para mayor información de estas innovaciones, consultar en los anexos 24 y 25 del informe técnico correspondiente al séptimo trimestre.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.2.2.6. Desarrollo de cuatro (4) encuentros interculturales.

A continuación, se relacionan las fechas y los lugares de los encuentros desarrollados.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

1. El día 10 de junio de 2019 se desarrolló el primer encuentro **intercultural de convivencia ciudadana** a nivel interveredal, donde participaron las Instituciones Educativas de la cuenca baja del Río Guayabero (Carpa, Colinas, Picalojo, Capricho), los habitantes del ETCR Jaime Pardo Leal, la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (UN). El evento denominado “**Conversatorio de convivencia ciudadana para la paz y la democracia ETCR colinas**”, tuvo como objetivo conocer el proceso de paz e interactuar con los actores del mismo, abriendo espacios de diálogo entre los estudiantes y los excombatientes.
2. El día 18 de julio de 2019 en el ETCR Jaime Pardo Leal, se desarrolló el **Segundo encuentro intercultural alrededor de la Seguridad Alimentaria y Nutricional**, con una participación activa de 26 personas, representantes de los indígenas del Espacio territorial, docentes de las instituciones educativas de la Cuenca baja del Río Guayabero priorizadas por el proyecto (Colinas, Caracol, Cerro Azul), y como invitados especiales, algunos sabedores indígenas y afrodescendientes presentes en el territorio. El objetivo del segundo encuentro, fue identificar los modelos productivos de las comunidades participantes y dialogar sobre las creencias y prácticas culturales que se tejen alrededor de la siembra y mantenimiento de las unidades productivas.
3. El día 07 de agosto de 2019 en el Espacio Territorial Jaime Pardo Leal, se desarrolló el **tercer (3) encuentro Intercultural** denominado **Selva Adentro**, que contó con una participación de 200 personas de las veredas Colinas, Caños Lajas, El cristal, excombatientes del ETCR y como invitados especiales una delegación de la comunidad indígena del Resguardo Panure y El Refugio. EL objetivo del evento fue generar espacios de interacción y dialogo entre las comunidades receptoras y los excombatientes de las FARC, esto con el fin de afianzar las relaciones y promover la reconciliación y reincorporación de una manera comunitaria.
4. Los días 11, 12 y 13 de octubre de 2019 en el Resguardo Indígena Panure, el proyecto Amazonía Joven de manera articulada con el proyecto Confianza y Paz territorial, ONF andina y la Misión de verificación de las Naciones Unidas, desarrolló el **cuarto encuentro intercultural** denominado “**Encuentro intercultural de paz y reconciliación entre los excombatientes indígenas de las Farc y los resguardos indígenas Tucano Oriental del Departamento del Guaviare.**”. Una actividad propuesta por los excombatientes indígenas de los Espacios Territoriales de Charras y Colinas, que contribuyó al **Punto 6.2 Componente Étnico** del Acuerdo Final para la terminación del conflicto.

. Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.2.7. Realización de dos (2) ferias de la innovación comunitaria

La presente actividad, tenía como objetivo brindar apoyo a las Instituciones Educativas atendidas por el proyecto Amazonía Joven, para el desarrollo de las ferias de ciencia e innovación que se

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

hacen de manera anual, resaltando el ingenio y la creatividad de los jóvenes, para resolver necesidades comunitarias a través del proceso pedagógico. Se pretendía socializar las experiencias pedagógicas significativas y las innovaciones comunitarias identificadas y sistematizadas de manera previa, como una forma de incentivar la cultura de la innovación a nivel rural. Sin embargo, dada la situación generada por el COVID 19, en donde por mas de un año no hubo presencialidad en los centros educativos rurales, dichos encuentros no pudieron desarrollarse, por ende, la actividad no se cumplió.

Es necesario aclarar, que esta actividad no tenía recursos específicos, se proyectó como un acompañamiento por parte del equipo técnico que atendía los centros educativos priorizados por el proyecto.

Esta actividad se considera NO CUMPLIDA:

A.2.2.8. Cuatro (4) Encuentros interculturales a nivel veredal e interveredales de Música, Danza y Deporte

A continuación, se relacionan las fechas y los lugares de los encuentros desarrollados.

1. Los días 18 y 19 de mayo de 2019, se realizó el **“PRIMER ENCUETRO DEPORTIVO INTEGRACION POR LA PAZ”**, en la vereda Charras, el cual fue organizado de manera articulada con la Junta de Acción Comunal JAC” y contó con la participación de las cinco escuelas deportivas que el proyecto Amazonia Joven viene liderando (**Puerto Nare, Caños Negros, Institución educativa Charras, ETCR Charras y comunidad indígena Nukak**).
2. El día 14 de junio de 2019, se desarrolló el primer encuentro interveredal de danzas, donde las escuelas culturales del ETCR Colinas, y de las Instituciones Educativas Colinas, Carpa y Caracol, demostraron las habilidades adquiridas en las clases desarrolladas por el dinamizador cultural. En total se desarrollaron 8 presentaciones por parte de las escuelas de danzas del proyecto Amazonía Joven, donde se destacaron los bailes tradicionales y contemporáneos.
3. El día 12 de septiembre de 2019, se desarrolló el segundo encuentro deportivo intercultural en la cuenca alta de Rio Guaviare (vereda Charras), que contó con la participación de 152 jóvenes de las Instituciones Educativas Puerto Nare, Charras, los Resguardos indígenas Caño Negro, Nukak, el ETCR Marco Aurelio Buen Día y campesinos de la vereda Charras. El objetivo del evento fue generar espacios de dialogo y visibilizar las habilidades adquiridas por los jóvenes que hacen parte de las escuelas deportivas del proyecto Amazonía Joven, posicionando el deporte y la cultura, como elementos para la activación comunitaria y el bienestar de los pobladores.
4. El día 24 de octubre de 2019, se desarrolló el segundo encuentro intercultural de danzas en el marco del proyecto amazonia joven, denominado **“Fiesta cultural y artística, por una sana convivencia”**. El evento fue propuesto y liderado por la Institución Educativa cerro Azul

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

y las escuelas culturales del proyecto, quienes tuvieron la oportunidad representar los bailes tradicionales del territorio. Este intercambio cultural permite reconocer, valorar y respetar las particularidades y singularidades que tiene cada comunidad, afianzando relaciones y posicionando alternativas para la ocupación del tiempo libre.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A.2.2.2. Seguimiento y acompañamiento a las escuelas de formación de danza y deporte, implementadas en las Instituciones Educativas Puerto Nare, Caño Negro, Charras, Carpa, Colinas, Cerro Azul y Caracoles.

Teniendo en cuenta los buenos resultados generados en las escuelas culturales y deportivas implementadas por el proyecto Amazonía Joven, se contempló darle continuidad a esta actividad a través de la adenda No 1, sin embargo y debido al COVID 19, a partir del mes de marzo del año 2020, las clases presenciales fueron suspendidas y se prohibió el desarrollo de encuentros que implicaban contacto físico o agrupamiento de personas. Así las cosas, y teniendo en cuenta que durante el año 2020 y principio de 2021, las clases presenciales no se reiniciaron, no fue posible continuar con el acompañamiento a las escuelas de formación culturales y deportivas implementadas en los centros educativos, razón por la cual, los dinamizadores centraron su trabajo en aquellos lugares donde se pudieran seguir desarrollando prácticas, sin poner en riesgo a la comunidad y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, como es el caso de los ETCR Charras y Colinas, así como el Resguardo Caño Negro y el asentamiento Nukak ubicado en la vereda Charras.

Esta actividad se considera cumplida, dado el trabajo que se realizó en aquellos lugares donde estaba la población objetivo y se podían cumplir los protocolos de bioseguridad. Para mayor información sobre todo el proceso desarrollado en las Escuelas Culturales y deportivas, consultar en los anexos 32 y 33 del informe técnico correspondiente al 6 trimestre.

Esta acción se considera **CUMPLIDA**.

A. 2.3 Fortalecimiento de capacidades locales en procesos de memoria histórica, reconciliación y resiliencia comunitaria.

A.2.3.1. Desarrollo de procesos para el rescate de costumbres y tradiciones culturales de comunidades indígenas y campesinas, como insumo para la reconstrucción de memoria histórica.

A.2.3.1. Talleres para la reconstrucción de memoria histórica con la participación de campesinos, indígenas y excombatientes.

La actividad de Memoria Histórica inició en el mes de junio del año 2020 con la contratación por parte FAO del Doctor Manuel Vega, quien implementó un plan de capacitación conceptual, en los cuatro núcleos priorizados por el proyecto Amazonía Joven (Núcleo Charras, Colinas, Resguardo Asunción y Calamar.), para lo cual, se desarrollaron encuentros virtuales y presenciales semanalmente. Posteriormente, en el mes de octubre del año 2020, se contrató la

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

agencia W&N Comunicaciones para el desarrollo de la propuesta denominada **“LA RUTA UN VIAJE AL PASADO”**, con el objetivo de **“Construir a través del video y la fotografía con jóvenes y adolescentes de los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, narrativas documentales que cuenten la historia del conflicto, la reconciliación y la apropiación de la tierra del que sus abuelos, padres e incluso ellos mismos, han sido parte.”**

En el marco de esta actividad y teniendo en cuenta los recursos y capacidad técnica de la organización, a través del equipo técnico se acompañó el proceso de convocatoria, socialización y selección de los jóvenes que fueron parte del proceso de formación, logrando de esta manera desarrollar 20 talleres presenciales, los cuales contaron con los respectivos protocolos de bioseguridad, en donde 40 jóvenes de los núcleos priorizados, se formaron en fotografía, video, construcción de guiones, producción y edición de videos, generando los siguientes resultados:

- producción de cuatro (4) documentales de no más de 5 minutos, en donde uno de ellos relata parte de la implementación del acuerdo de Paz en el territorio, especialmente en el ETCR Jaime Pardo Leal, mientras que los tres (3) documentales restantes, relatan la historia de la Colonización en la vereda Charras, en el Resguardo Asunción y en el Municipio de Calamar. Videos de una alta calidad, pensados y desarrollados por los jóvenes del territorio.
- Se creó un banco de sesenta (60) fotografías en alta calidad, que evidencia el proceso desarrollado a través de los talleres.
- Cuarenta (40) fotografías de doble exposición, tomadas por los jóvenes de cada uno de los núcleos, que reflejan la cultura, la paz, la esperanza y el territorio.
- Un video final, que da cuenta de todo el proceso de capacitación desarrollado, resaltando los resultados y las impresiones de los jóvenes.

Como complemento al acompañamiento técnico y logístico desarrollado por Hilfswerk en cada uno de los talleres (almuerzos, refrigerios, transporte, servicio de internet), y con el ánimo de generar una capacidad instalada, se realizó la entrega de un kit audiovisual a los núcleos priorizados, de tal manera que los jóvenes continúen la producción de material audiovisual, aun después de terminados los talleres, fortaleciendo de esta manera las páginas digitales y emisoras comunitarias del sector rural, en especial, las que se encuentran en las veredas atendidas.

Cada kit audiovisual entregado, este compuesto por los siguientes equipos:

- ❖ 1 computador ACER portátil AN515-55-53AG NITRO5, procesador Intel core i5.
- ❖ 1 cámara semiprofesional Nikon Coolpix P900 Pixeles efectivos (Megapíxeles).

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Kit audiovisual entregado a la asociación ASOJEC.

Los informes finales de esta actividad, fueron enviados por parte de la agencia W&N Comunicaciones a FAO, mediante correo electrónico, en donde se detallan las actividades desarrolladas y se anexan los productos. En este orden de ideas, las labores de acompañamiento técnico y logístico por parte de nuestra organización, se desarrollaron de acuerdo a lo planeado, así las cosas, se da por cumplida la actividad.

Informe 12 final.

Teniendo en cuenta los resultados generados en el marco de la actividad de Memoria Histórica, que incluye un proceso de formación a niños, niñas y jóvenes de las comunidades indígenas, campesinas y excombatientes, además de un material fotográfico y audiovisual que retrata los procesos de colonización en los Municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare, se evidenció la necesidad de visibilizar el trabajo realizado, que permitiera dar a conocer parte de la historia de Colonización en el territorio e identificar alianzas estratégicas que garanticen darle continuidad a este tipo de acciones.


En este orden de ideas, de manera articulada con el socio implementador FAO, durante el mes de agosto se celebraron dos (2) eventos de exposición de Memoria Histórica denominados **“Memoria, Historia y Paz. Una lente para el futuro**, desarrollados en el Municipio de San José del Guaviare durante los días 2,3 y 4 de agosto y en la ciudad de Bogotá el día 27 de agosto del presente año. Durante estos encuentros, se realizó una exposición literaria y audiovisual de los resultados generados en el marco de la actividad de Memoria histórica, desarrollada con 80 jóvenes de las comunidades, indígenas, campesinas y excombatientes, quienes a través de un proceso de formación conceptual y en TICs, recopilaron y sistematizaron el proceso de colonización del departamento del Guaviare. Los eventos ya mencionados, contaron con la presencia de autoridades locales, nacionales y la academia, con quienes se busca darle continuidad a este tipo de actividades, ya que, contribuye a la generación de identidad cultural en las nuevas generaciones.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Metodológicamente cada uno de los encuentros se desarrolló en seis (6) momentos, con el fin, de orientar e introducir a los visitantes al proceso que se desarrolló por cinco meses con ochenta (80) jóvenes campesinos, indígenas y excombatientes que habitan el Departamento del Guaviare:

➤ **Momento 1. Exposición del proceso.**

Compuesto por 10 pendones impresos en Banner a full Color y 5 retablos con fotografías de 50 x 70 cm, que daban muestra de cómo se realizó el proceso de selección de los jóvenes, la formación conceptual y metodológica, la capacitación en el uso de cámaras, computadores y demás elementos audiovisuales, hasta llegar al desarrollo de entrevistas y fotografías, que permitieran relatar el proceso de colonización en cada una de sus comunidades.

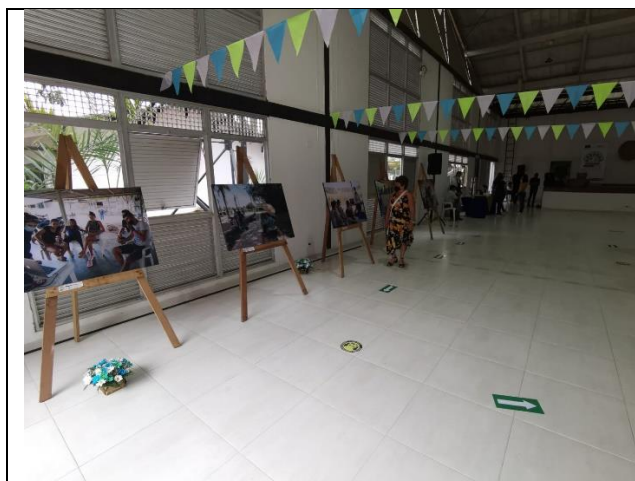

Momento 1. Exposición del proceso San José del Guaviare



Momento 1. Exposición del proceso Bogotá.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

➤ Momento 2. **Stand Guía Metodológica:**

Compuesto por 6 pendones tipo flecha impresos en Banner a Full Color y 5 cubos didácticos, que daban muestra de la metodología utilizada a la hora de realizar el trabajo con las comunidades. Una metodología compuesta de diez (10) módulos, cada uno de los cuales constituido en un paso a paso, para trabajar de una manera asertiva con los jóvenes. Vale la pena aclarar, que esta metodología utilizó las TICs, como alternativa a las diferentes situaciones generadas por el COVID 19.



Momento 2. Stand Guía Metodológica, San José del Guaviare.




Momento 2. Stand Guía Metodológica, Bogotá.

➤ Momento 3. **Relatos:**

Compuesto por 10 retablos de 80 x 100 y 7 fotografías de 50 x 70, en donde algunos Colonos campesinos, sabedores indígenas y líderes de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR); relatan como fue el proceso de Colonización del Departamento del

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Guaviare y cómo, las diferentes bonanzas (pieles, Caucho, Marihuana, Coca), así como la aparición de grupos armados (guerrillas y AUC), fueron escribiendo la historia de este territorio. Relatos de algunos, pero que representan a muchos Guaviarenses.

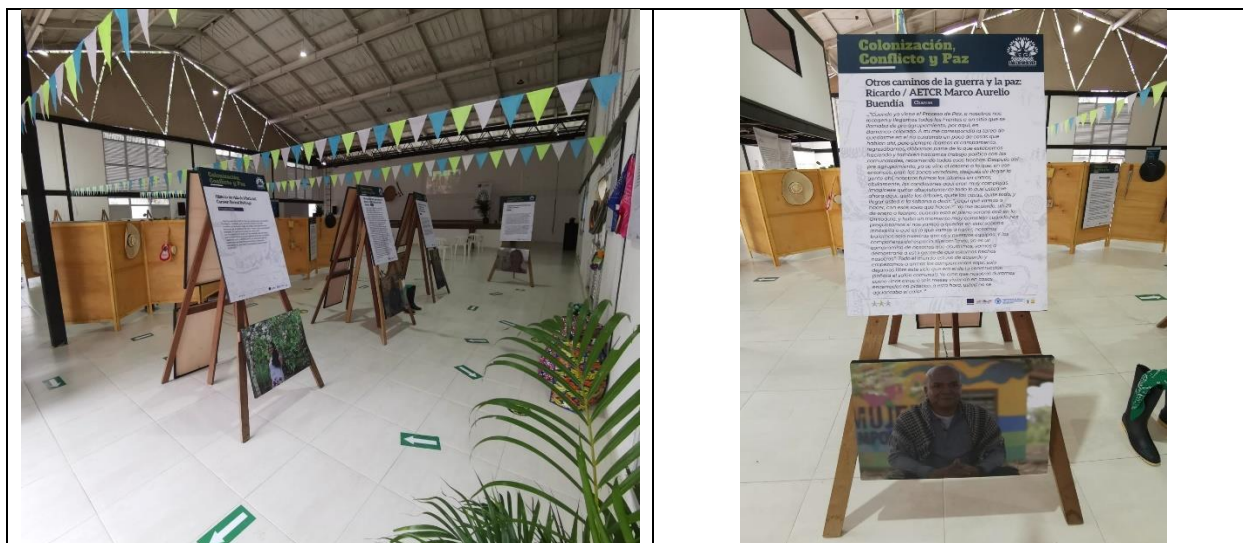

Momento 3. Exposición de Relatos, San José del Guaviare.



Momento 3. Exposición de Relatos, Bogotá.

➤ **Momento 4. Fotografías de doble exposición.**

40 fotografías de doble exposición, 10 por cada comunidad, realizadas por los jóvenes que participaron del proceso, luego de recibir capacitación y dotación de equipos requeridos para tal fin. Cada fotografía representa una historia, un sentimiento de un individuo o comunidad.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Momento 4. Fotografías de doble exposición, San José del Guaviare.



Momento 4. Fotografías de doble exposición, Bogotá.

➤ **Momento 5. Exposición Gastronómica.**

A la par del proceso de memoria histórica, se realizó un proceso con las comunidades campesinas, reincorporadas e indígenas, sobre memoria gastronómica, en la cual, con la ayuda de un chef profesional de FAO, se rescataron las recetas emblemáticas de cada uno de estos pueblos, las cuales se sistematizaron en un recetario que fue expuesto en los eventos, junto con el libro “Colonización, Conflicto y Paz”. En este Stand, 2 representantes de cada comunidad, expusieron sus platos y explicaron el significado de cada uno de ellos de acuerdo a su cosmovisión.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Momento 5. Exposición Gastronómica, San José del Guaviare.



Momento 5. Exposición Gastronómica, Bogotá.

➤ **Momento 6. Conversatorio.**

El conversatorio, se constituye en el último momento del evento, en donde representantes de la comunidad, institucionalidad y la academia, hicieron una reflexión sobre el trabajo desarrollado y la importancia que tiene este en la resiliencia comunitaria, la paz territorial y la identidad cultural. A través de preguntas orientadoras, se generó un dialogo sobre las metodologías utilizadas, las estrategias que permitan generar sostenibilidad en este tipo de acciones y la relevancia que tiene para los jóvenes la Memoria Histórica de su territorio, una acción que es relativamente nueva e innovadora si se tiene en cuenta la incorporación de los contenidos audiovisuales.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Momento 6. Conversatorio, San José.



Momento 6. Conversatorio, Bogotá

Con el desarrollo de estos dos encuentros, se da por terminada la actividad de Memoria Histórica, en donde se generaron conocimientos y capacidades a 80 jóvenes rurales pertenecientes a comunidades indígenas, campesinas y excombatientes, adicionalmente, se generó una capacidad instalada a través de la entrega de equipos (computadores, cámaras) y como productos, se recopiló y sistematizó de manera literaria y audiovisual el proceso de colonización del Departamento del Guaviare, desde la cosmovisión de cada pueblo.

Anexo 2. Listado de asistencia evento San José.

Anexo 3. Listado de asistencia evento Bogotá.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.2.3.2. Fortalecimiento de capacidades locales.

A.2.3.2. Consultoría en innovación comunitaria y gestión de Conocimiento de las acciones desarrolladas por Hilfswerk Internacional en el marco del Proyecto Amazonía Joven.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Esta actividad de la adenda busca dar continuidad a la actividad anterior (**A.2.3.2.**).

A lo largo del proyecto se desarrolló una consultoría en Innovación Comunitaria, a través de la cual, un profesional con amplia experiencia lidera el proceso de desarrollo organizacional y gestión de conocimiento, de las actividades contratadas por Hilfswerk Internacional en el marco del proyecto Amazonía Joven. Así mismo fue la persona encargada de orientar la planeación e implementación de los diferentes encuentros contemplados en el POA.

Esta acción se considera **CUMPLIDA.**

R3. Las Cuencas de los ríos Guaviare y Guayabero cuentan con bienes públicos mejorados con la participación de las comunidades (y de los jóvenes) y con cofinanciación gubernamental, contribuyendo a la inclusión socioeconómica y a la conectividad territorial

A.3.3. Construcción y reparación de obras de infraestructura social y educativa.

A.3.3.1 Realización de reuniones de acercamiento con la institucionalidad departamental y municipal.

A lo largo del primer año del proyecto (2019), se sostuvieron diferentes encuentros y reuniones con la Gobernación del Guaviare, la Secretaría de Educación Departamental y Municipal de San José del Guaviare, así como con las Juntas de Acción Comunal de las veredas priorizadas, con quienes se socializó el proyecto y las actividades relacionadas con la adecuación y/o construcción de infraestructura social y educativa.

Para mayor información, en el informe técnico del 4, 5 y 6 trimestre, se encuentra el detalle y los anexos de las reuniones desarrolladas.

Esta acción se considera **CUMPLIDA.**

A.3.3.2 Socialización de las acciones a desarrollar en temas de infraestructura a nivel veredal.

Cada una de las obras priorizadas, fue socializada y concertada con las comunidades rurales, esto, teniendo en cuenta, que la contrapartida de la comunidad, es la mano de obra calificada y no calificada, ya que el proyecto no financia este tipo de actividades. Sin embargo, para asegurar la seguridad y la calidad de las estructuras construidas y/o desarrolladas por el proyecto, hay una supervisión de un Ingeniero civil con amplia experiencia, que realiza los diseños y el seguimiento constante.

Para mayor información, en el informe técnico del 4, 5 y 6 trimestre, se encuentra el detalle y los anexos de las reuniones desarrolladas.

Esta acción se considera **CUMPLIDA.**

A.3.3.3 Diagnóstico del estado actual de las obras tanto educativas.

Esta acción se considera **CUMPLIDA.**

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

A.3.3.4 Elaboración de diseños o planos, para construcción de infraestructura comunitaria y de adecuación.

Las obras priorizadas por la comunidad, cuentan con un diseño y plan de compras, elaborados por un Ingeniero civil, con amplia experiencia en el campo.

Para mayor información, en el informe técnico del 4, 5 y 6 trimestre, se encuentra el detalle y los anexos de las reuniones desarrolladas.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.3.3.5 Realización de Jornadas de trabajo comunitario para la recuperación de infraestructura social y educativa.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.3.3.6 Construcción de obras civiles

A continuación, se relaciona un cuadro en el cual se detallan las obras comunitarias y educativas desarrolladas en el marco del proyecto.

Construcción y reparación de obras de infraestructura EDUCATIVA Y COMUNITARIA					
Resultado	Nombre de la obra	Ubicación	línea	valor total	Estado
R.3.3	Sistema De Pozo Séptico De 1000 Lt Para Aguas Residuales Del Restaurante	Institución Educativa El Edén Sede Puerto Nare	Infraestructura Educativa	\$ 1.811.950	Realizada
	Cambio De Cubierta En Biblioteca E Internados	Institución Educativa El Edén Sede Puerto Nare	Infraestructura Educativa	\$ 5.459.300	Realizada
	Cambio De Cubierta	Institución Educativa Charras	Infraestructura Educativa	\$ 6.469.000	Realizada
	Sistema De Captación De 20.000litros De Aguas Lluvias - Articulado Con El Programa Confianza Y Paz	Institución Educativa Charras	Infraestructura Educativa	\$ 5.180.695	Realizada
	Construcción De Baterías Sanitarias - Articulado Con El Programa Confianza Y Paz	Institución Educativa Charras	Infraestructura Educativa	\$ 2.177.591	Realizada
	Encerramiento 290 mts lineales	Institución Educativa El Cristal Sede Colinas	Infraestructura Educativa	\$ 8.627.830	Realizada
	Encerramiento 160 Metros lineales	Institución Educativa La Carpa	Infraestructura Educativa	\$ 4.038.500	Realizada
	Ampliación De Restaurante Escolar	Institución Educativa Triunfo II Sede Caracol	Infraestructura Educativa	\$ 11.573.900	Realizada
	Reparación De Baterías Sanitarias	Institución Educativa El Edén Sede Puerto Nare	Infraestructura Educativa	\$ 5.347.000	Realizada
	Reparación Aulas	Institución Educativa Charras	Infraestructura Educativa	\$ 6.352.000	Realizada
	Construcción Maloca Intercultural	Institución Educativa Cerro Azul	Infraestructura Educativa	\$ 22.062.000	Realizada
	Construcción Aula Múltiple - Articulado con FAO	Institución Educativa El Cristal Sede Colinas	Infraestructura Educativa	\$ 12.000.000	Realizada

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Construcción Placa Pequeña	Institución Educativa Charras	Infraestructura Educativa	\$ 7.000.000	Realizada
Construcción Cocina Comunitaria	Resguardo Indígena La Asunción	Infraestructura Comunitaria	\$ 11.240.200	Realizada
Reparación de la Red de acueducto	vereda caracoles	Infraestructura Comunitaria	\$ 5.218.900	Realizada
Mejoramiento cocina comunitaria	vereda caracoles	Infraestructura Comunitaria	\$ 4.141.000	Realizada
Construcción De Parque Biosaludable	Vereda La Carpa	Infraestructura Comunitaria	\$ 17.980.000	Realizada
TOTAL, INVERTIDO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y COMUNITARIA			\$ 136.679.866	

En total se realizó una intervención en 17 obras por un valor de **\$ 136.679.866.00** sin contar transporte de materiales. De las 17 obras relacionadas, 13 corresponden a la línea educativa y 4 a la línea comunitaria. Del total de las obras intervenidas, se destacan como obras construidas, el sistema de captación de aguas lluvias y las baterías sanitarias en la Institución Educativa (I.E) Charras, el aula tipo Maloca en la I.E Cerro Azul, el aula múltiple construida en la I.E Colinas y a nivel comunitario, el parque biosaludable en la vereda Charras y la cocina comunitaria construida en el Resguardo Asunción, obras que se destacan por tener una mayor inversión.

Se dan por adecuadas y/o construidas las obras priorizadas de manera inicial en el marco del proyecto, por ende, esta actividad se da por cumplida. Los soportes como informes, actas de entrega y registros fotográficos, se han anexado en cada uno de los informes trimestrales presentados al socio FAO.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.3.4. Construcción y mejoramiento de infraestructura productiva y turística.

A.3.4.1. Realización de reuniones de acercamiento con la institucionalidad departamental y municipal.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.3.4.2. Socialización de las acciones a desarrollar en temas de infraestructura a nivel veredal.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.3.4.3. Diagnóstico del estado actual de las obras productivas y turísticas.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

A.3.4.4. Elaboración de diseños o planos, para construcción o adecuación.

Todos los planos y/o diseños de infraestructura se entregaron en el informe de sexto trimestre.

Esta acción se considera CUMPLIDA.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

A.3.4.5. Realización de Jornadas de trabajo comunitario para la recuperación de infraestructura productiva.

Informe 12 final.

1. Construcción de Planta de transformación de especias aromáticas y condimentos

Teniendo en cuenta las modificaciones y actividades de obra adicionales sugeridas por personal de FAO para la Planta de transformación de especias, no se ha podido culminar la construcción de la estructura ya que, se requieren hacer unas reformas estructurales que impiden hacer los pisos y pintar paredes. Es necesario aclarar, que para el desarrollo de dichas actividades, la FAO asumió el compromiso de entregar los materiales necesarios, sin embargo, al momento de la liquidación de la adenda de Hilfswerk (31 de agosto 2021), dichos materiales no se habían adquirido. En este orden de ideas, la obra se considera que sigue en desarrollo, pero a partir del mes de septiembre, el seguimiento técnico y la entrega de insumos es asumido por FAO.

2. Construcción de caseta turística y comunitaria en el Raudal del Guayabero

Actividades desarrolladas durante el mes de agosto:

ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Pañete muros	m ²
Construcción mesón cocina	ml
Enchape mesón	m ²
Estuco	m ²
Instalación puerta principal	Und
Instalación puerta bodega	Und
Avance en Instalación cerámica	m ²



Actividad: Pañete muros



Actividad: Enchape mesón cocina

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Anexo 4. Informe avance de obra caseta turística.

según lo acordado con la coordinadora nacional del proyecto Doctora Ana Carrizosa, a partir del mes de septiembre, el seguimiento técnico será asumido por FAO.

Sin embargo, en lo que respecta al trabajo realizado por la organización Hilfswerk internacional, se hizo acompañamiento hasta donde hubo la posibilidad de acuerdo al OPA firmado. En este orden de ideas esta acción se considera cumplida.

Esta actividad se considera en **CUMPLIDA**.

A.3.4.6. Construcción de obras civiles

Toda vez que las obras se concluyan, se anexarán las correspondientes actas de entrega.

1. El día 31 de agosto de 2021, se realizó una entrega parcial de obra a la junta de acción comunal y a la asociación turística, de la obra denominada “**Caseta Turística y Comunitaria del Raudal del Guayabero**”, con un avance en la ejecución de un 92% en las actividades. Esta importante obra que busca fortalecer el turismo comunitario en la ribera del río Guayabero, cuenta con un salón principal de 49 metros cuadrados, cocina comunitaria de 17.5 metros cuadrados y bodega o zona de almacenamiento de 17.5 metros cuadrados, cubierta en teja arquitectónica, con acabados de muros estucados, mesones en Porcelanato y pisos en cerámica. Esta obra fue construida de manera articulada con la Secretaría de Cultura y Turismo de la Gobernación del Guaviare y el socio FAO que aportó los recursos para la mano de obra. Es necesario mencionar, que para esta obra ya se cuentan con todos los materiales necesarios para su culminación, sin embargo, se hace la entrega parcial por parte de Hilfswerk, debido a la culminación del OPA.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Actividad: Entrega parcial de obra

Anexo 5. Acta de entrega parcial, caseta turística.

A continuación, y con el ánimo de facilitar el seguimiento técnico del socio FAO, se detallan las obras productivas y turísticas que se encuentran en desarrollo, con las actividades que se han realizado a corte de 31 de agosto de 2021, y las actividades pendientes por desarrollar.

NOMBRE	UBICACIÓN	ESTADO % DE AVANCE	ACTIVIDAD POR DESARROLLAR
Construcción de de transformación de plantas de especias aromáticas	Vereda los Alpes	Avance de obra 85% Actividades desarrolladas • Cimentación • Columnas • Mampostería • Pañete • Mesón • Enchape mesón cocina • Batería sanitaria • Cubierta • Horno deshidratador	• Columneta en concreto 15x20cm • Viga de cimentación 15x20cm • Muro en bloque #4 divisorio • Pañete muro • Filos y dilataciones • Instalación puerta • Estuco • Pintura • Placa piso en concreto e= 7cm • Instalación cerámica piso
Construcción de caseta turística y comunitaria	Vereda Raudal del Guayabero	Avance de obra 92% Actividades desarrolladas • Cimentación • Instalación estructura metálica • Cubierta • Placa piso en concreto • Mampostería • Pañete • Estuco muros internos • Pintura muros exteriores • Mesón y enchape.	• Filos y dilataciones • Estuco muro fachada lateral • Pintura • Terminación de la instalación de cerámica piso

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

A continuación, se relaciona un cuadro en el que se detallan las obras comunitarias y educativas que se están desarrollando en el marco del proyecto Amazonía Joven.

Resultado	Nombre de la obra	Ubicación	línea	valor total	Estado
R.3.4	Construcción de infraestructura para la producción de panela	vereda caracoles	Infraestructura Productiva	\$ 25.000.000	Realizada
	Construcción de una planta de transformación de especias aromáticas y condimentos	Vereda Alpes	Infraestructura Productiva	\$ 16.613.600	En ejecución
	Construcción de caseta de transformación de productos étnicos	ETCR Colinas	Infraestructura Productiva	\$ 30.100.000	Realizada
	Construcción de casetas de transformación de productos étnicos en resguardos Indígenas	Resguardo La Asunción	Infraestructura Productiva	\$ 15.400.000	Realizada
	Construcción de Taller de confecciones	ETCR Colinas	Infraestructura Productiva	\$ 25.000.000	Realizada
	Construcción de caseta turística y comunitaria	Raudal del Guayabero	Infraestructura turística	\$ 26.340.700	En ejecución
TOTAL, INVERTIDO EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y TURISTICA				\$ 138.454.300	

Es necesario aclarar que, la caseta para la transformación de productos Étnicos y el taller de confecciones que se construyeron en el ETCR Colinas, se relacionan como infraestructura productiva, sin embargo, el detalle del avance de estas obras se encuentra en el Resultado 4.

Aunque se evidencia que aún falta por terminar la construcción de dos obras de infraestructura (planta de transformación de especias y caseta turística), debido a la culminación del OPA, hilfswerk internacional no seguirá haciendo el seguimiento, por lo tanto, se avanzó hasta donde hubo la posibilidad. En este orden de ideas esta acción se considera cumplida.

Esta actividad se considera en CUMPLIDA.

A continuación, se describen las actividades contempladas en el R4, el cual es específico para los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día.

R4. Los Espacios territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) ejecutan proyectos de inclusión social y productiva, a través de sistemas alimentarios que fortalecen la seguridad alimentaria y emprendimientos colectivos / asociativos agrícolas y no agrícolas con sostenibilidad ambiental.

De manera inicial se realizó un proceso de socialización y concertación con los líderes de los ETCR Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día, en donde se expusieron las diferentes actividades que el proyecto Amazonía Joven desarrollará a través Hilfswerk Internacional. Se informó, que con el ánimo de generar oportunidades laborales a la población en proceso de reincorporación y contar con un apoyo logístico en terreno, que permita disminuir los desplazamientos del equipo técnico en tiempos de pandemia, el proyecto contratará un

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

dinamizador comunitario para cada espacio, el cual debe tener disponibilidad de tiempo, ejercer liderazgo y no estar impedido para ejercer contratos laborales. Se hizo énfasis en que la selección de cada monitor debe hacerse de una manera concertada y debe representar a toda la comunidad, de igual manera, se acordó conformar un comité impulsor o de seguimiento, el cual debe representar las diferentes organizaciones y grupos poblacionales que habitan dentro de los ETCR, cuya responsabilidad será apoyar la implementación de las acciones y hacer seguimiento al desarrollo de las mismas.

Así las cosas, en el mes de junio se recibieron de manera formal el nombre y las hojas de vida de aquellas personas que cada ETCR propone para desarrollar el cargo de dinamizador comunitario. Para el ETCR Jaime Pardo Leal, se postuló y contrató al señor Feliciano Flórez Toro y para el ETCR Marco Aurelio Buen Día, se postuló y contrató al señor Vicente Ortiz. Estas dos personas iniciaron a laborar con Hilfswerk a partir del mes de Julio del año 2020 y dentro de sus primeras actividades fue la conformación de los equipos impulsores.

COMITÉ IMPULSOR O DE SEGUIMIENTO	
ETCR JAIME PARDO LEAL	ETCR MARCO AURELIO BUEN DÍA
Feliciano Flórez Toro	Francisco Gamboa
Jesús Diomedes Flórez Torres	Víctor Umaña
José Manuel Guerrero González	Diana Carola Vargas
Leonardo Ramírez Rodríguez	Leydi Yurany Morales
Omar Alfonso Arévalo Barahona	Dora Yonda Suns
Olga Angélica Barahona Guzmán.	Fabio Barrera Medina
	Sebastián González
	Luis Carlos Forero.

A.4.1. Implementación de dos (2) unidades productivas con enfoque diferencial (Chagras Indígenas), que permitan fortalecer la Autonomía alimentaria de los excombatientes indígenas.

A.4.1.1. Levantamiento de línea base inicial.

De manera inicial se hizo un acercamiento con la población indígena reincorporada que habita los ETCR, con quienes se definió el número de participantes para el establecimiento de las Chagras Indígenas tradicionales. En el ETCR Jaime Pardo Leal de Colinas se preinscribieron 25 personas, al igual que en el ETCR Marco Aurelio Buen Día, posteriormente, se concertó el plan de trabajo a desarrollar, el cual incluye los temas de capacitación, el tipo o modelo de chagra, los insumos y semillas requeridos, así como las herramientas de trabajo. Para la aplicación de la línea base inicial y final se utilizará la herramienta Koobo, a través de la cual se levantará información primaria en aspectos productivos, económicos y sociales.

Durante el Octavo trimestre se realizó la aplicación de la herramienta Koobo, la cual se diligenció al núcleo familiar de cada uno de los participantes de las Chagras indígenas tradicionales. En un primer ejercicio, correspondiente al análisis del acceso y consumo de alimentos, se pudo identificar que en los ETCR hay disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad, teniendo en cuenta que la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), asume la alimentación de cada Espacio. Así las cosas, aunque el establecimiento de las chagras busca incentivar la

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

soberanía alimentaria de las comunidades indígenas en proceso de reincorporación, también pretende generar un proceso de revitalización cultural alrededor de los usos y costumbres de los modelos productivos propios.

En torno al acceso de servicios básicos, los ETCR cuentan con una Planta de tratamiento de Agua Potable (PTAP) y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aunque su mantenimiento no es constante y la capacidad es limitada, ya que los ETCR o antiguamente zonas veredales, se habían proyectado como espacios transitorios (inferior a 6 meses), por lo tanto, las PTAP y PTAR han excedido sus capacidades de uso. A nivel de fluido eléctrico, los ETCR cuentan con plantas eléctricas que garantizan el servicio de manera constante, adicionalmente y gracias al proyecto Amazonía Joven, desde el año 2020, cuentan con servicio de internet. En relación a la generación de ingresos, de manera mensual cada excombatiente que se encuentra en la base de datos de la ARN, recibe una asignación o renta básica, que corresponde al 90% de un salario mínimo mensual vigente y tienen derecho a un incentivo por un valor de \$ 8.000.000 para cofinanciar un proyecto del orden productivo. En torno a la vivienda, cada espacio cuenta con unas unidades habitacionales transitorias construidas en superboard, sin embargo, estas no cuentan con las características adecuadas que permitan generar calidad de vida, aunque en los acuerdos de paz se estipulo un subsidio para que los excombatientes puedan acceder a casa propia.

En la actividad de Chagras tradicionales participaron **33 Núcleos familiares y 81 individuos**, de los cuales, 21 corresponden al ETCR Marco Aurelio Buen Día de Charras y 12 al ETCR Jaime Pardo Leal de Colinas. En el ETCR Charras se benefician de manera directa 54 personas, de los cuales 28 son hombres y 26 mujeres; 1 hombre joven y 1 mujer joven. En el ETCR Colinas se benefician de manera directa 27 personas, de los cuales 17 son hombres y 10 mujeres; No hay jóvenes, hay 6 niñas menores de 5 años y 1 niño menor de 5 años.

Para mayor información, en el anexo 10, del informe correspondiente al trimestre No 11, se encuentra el documento de análisis de la línea base inicial.

Esta actividad se considera en **CUMPLIDA.**

A.4.1.2. Diseño participativo del modelo de chagra indígena tradicional y plan de compras, construido participativamente.

En el anexo 40, correspondiente al informe técnico del trimestre N° 7, se detalla el modelo de chagra tradicional y plan de compras, diseñado con la comunidad indígena de los ETCR Charras y Colinas.

Esta actividad se considera en **CUMPLIDA.**

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

A.4.1.3. Fortalecimiento de la autonomía alimentaria e inclusión étnica productiva, mediante Implementación de las dos (2) unidades productivas con enfoque diferencial (chagras indígenas), dentro de los ETCR.

Las chagras ya fueron implementadas y se encuentran en desarrollo, gracias al acompañamiento técnico permanente y a la entrega de insumos, semillas y herramientas por parte del proyecto Amazonía Joven. Sin embargo, vale la pena aclarar, que en la chagra ubicada en la finca Nuevo horizonte de la vereda Charras, los cultivos semestrales como el maíz, arroz, caña, tabena, ñame y chonque, han retrasado su desarrollo, debido a la llegada del verano, que en el departamento del Guaviare inicia a mediados del mes de diciembre. Es de anotar, que los suelos de la finca nuevo horizonte, son suelos de texturas finas con baja retención de humedad y altas saturaciones de hierro y aluminio, lo que causa una toxicidad en las plántulas. Frente a esta situación, el técnico agropecuario y el Ingeniero Agrónomo de Hilfswerk, iniciaron un proceso de formación con los participantes, para la implementación de coberturas vegetales que permitan mitigar la intensidad de los rayos solares, fije humedad al suelo en horas de la madrugada y genere materia orgánica.

En relación a la Chagra de la Vereda Colinas, presenta un excelente desarrollo, debido a las características de los suelos, a las lluvias atípicas que se presentaron en esta zona durante los meses de diciembre y enero y al trabajo que constantemente realiza la comunidad indígena en proceso de reincorporación. Durante el décimo trimestre, se continuó cosechando Yuca, Plátano, Cocona, Ají y Achiote. Así mismo, se inició la construcción de la planta de transformación, para la preparación de almidón de yuca, casabe y fariña.

	
Cultivo de banano, chagra ETCR Colinas.	Cultivo de Yuca Chagra ETCR Colinas.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

	
Suelos de la finca nuevo horizonte.	Cultivo de Yuca Chagra ETCR Charras.

Cada una de las Chagras tiene una extensión de 2 hectáreas y debido a la ausencia de tierra fueron ubicadas por fuera de los ETCR. A través del proyecto, se entregaron mas de 20 especies de plantas, entre frutales, medicina tradicional, artesanías y arboles maderables, destacándose la entrega de 8 variedades de yuca brava, 20 variedades de ají amazónico y 5 variedades de caña. De igual manera y para incentivar el trabajo comunitario, se realizó la dotación con un banco de herramientas y utensilios para la preparación de alimentos propios. Se proyecta que estas chagras tengan una vida útil de más de 5 años y se convierta en fuente de semillas para la implementación de nuevas unidades productivas.

Para mayor información de los elementos entregados y las actividades desarrolladas, en los informes del 7 y 8 trimestre se encuentra una mayor descripción de esta actividad, así como los anexos correspondientes.

- Anexo 41 y 42 informe técnico 7 trimestre, actas de entrega de herramientas a los ETCR.
- Anexo 48 informe técnico 7 trimestre, acta de entrega utensilios para la preparación de alimentos tradicionales.
- Anexo 60, 61 y 62 informe técnico 8 trimestre, actas de entrega semillas en los ETCR.

Esta actividad se considera en **CUMPLIDA**.

A.4.1.4. Acompañamiento técnico para el fortalecimiento de la autonomía alimentaria y unidades productivas.

Con las visitas realizadas desde el mes de agosto de 2020 y hasta el mes de marzo del año 2021, se da por culminada la presente actividad, dado que se cumplió con el plan de capacitación para las chagras estipulado en el anexo 43 del informe técnico del 7 trimestre. Así mismo, el mes de marzo se da por liquidado el contrato laboral con el personal técnico y profesional encargado de realizar el acompañamiento. Para mayor información, en los informes técnicos del 8, 9 y 10 trimestre, hay una descripción del acompañamiento realizado de manera mensual, así como los respectivos medios de verificación (fotos y listados de asistencia.).

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

Esta actividad se considera en **CUMPLIDA.**

A.4.1.5. Levantamiento línea base final

Informe 12 final.

Se anexa el documento de análisis de la línea base final.

Anexo 6. Documento de análisis línea base final.

Esta actividad se considera en **CUMPLIDA.**

4.2. Acceso a TICs en las Instituciones Educativas de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.

A.4.2.1. Facilitar el suministro de los Servicios de internet para los Espacios de Capacitación y Reincorporación Charras y Colinas, que permitan fortalecer los procesos de Alfabetización Digital con población reincorporada.

Desde el mes de febrero del año 2020, Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día, cuentan con servicio de internet, con una capacidad de 10 megas cada uno. Dada la firma de la adenda No 4 entre FAO y Hilfswerk, el servicio de internet para los ETCR, se garantiza hasta el mes de Julio del año 2021.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA.**

A.4.2.2. Capacitaciones para lograr la alfabetización digital, asegurando el acceso a las TIC's en Espacios de Capacitación y Reincorporación Charras y Colinas.

Durante el mes de marzo, se desarrolló la ceremonia de graduación de los aprendices del proceso de alfabetización digital desarrollado por el proyecto Amazonía Joven, en donde gracias a un proceso articulado con el SENA, se logró la apertura de cuatro cursos básicos de introducción a las TICs, (**Alfabetización informática, manejo intermedio de la herramienta de hojas de cálculo en Excel, Informática: Microsoft Word – Excel -Internet y Word Avanzado**). En total, se vincularon al proceso más de 50 aprendices, sin embargo, solo 46 se graduaron en algunos de los cuatro cursos, 27 de los graduandos pertenecen a la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buen Día de charras y 19 pertenecen al Espacio Territorial Jaime Pardo Leal.

Vale la pena destacar, que, como complemento a este proceso, el proyecto Amazonía Joven instaló un aula digital en cada uno de los ETCR, en donde se dejó una capacidad instalada (equipos de cómputo, televisores, vadeo beam, e internet). Así mismo, y como estrategia de salida, se acordó con el SENA la apertura de un técnico en sistemas, en donde la base sean los 46 aprendices que se graduaron de los cursos complementarios, los cuales manifiestan la voluntad de continuar su proceso de formación.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Jornada de graduación Población en Proceso de Reincorporación – Alfabetización digital



Jornada de graduación ETCR Colinas



Jornada de graduación ETCR Charras.

Para mayor información, en el informe del décimo (10) trimestre, en el anexo 41, se relaciona la base de datos de los aprendices graduados en los ETCR Charras y Colinas.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA.**

A.4.2.3. Dotación con material tecnológico que permita complementar los procesos de alfabetización digital.

Gracias a los equipos entregados y a la adecuación estructural de unos espacios dentro de los ETCR, se logró el establecimiento de **dos (2) aulas digitales**, las cuales cuentan con equipos

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO CON FAO EL 22/10/2018. PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

de cómputo, escritorios, televisores y acceso a internet. A continuación, se detallan los elementos entregados en cada Espacio Territorial:

- **Once (11) Computadores portátiles marca Hiuli Parker (HP) todo en uno.** Pc 22-d0006la procesador Intel Core I 3-1005G1, pantalla de 21'5 pulgadas. Memoria RAM de 8 gb, disco duro de 1 tera (1000 Gb), Windows 10 home, grabador de dvd.
- **Un (1) Televisor pantalla plana marca LG de 49 pulgadas 123cm, real 4K-ultra hd.**
- **Quince (15) Guayas de seguridad para computador todo en uno XUE X4D35, color negro de 4 dígitos.** Cabe aclarar que se entregan 15, ya que de manera previa se habían entregado 4 computadores portátiles.
- **Un (1) Soporte de seguridad Home Desing para tv de 49 pulgadas.**
- **Quince Pad mouse Kalley K-GGMOPAD micro fibra, base de goma.** Cabe aclarar que se entregan 15, ya que de manera previa se habían entregado 4 computadores portátiles.



Aula digital ETCR Jaime Pardo Leal ETCR Colinas.



Aula digital ETCR Marco Aurelio Buen Día de Charras.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Para mayor información de las aulas digitales, las actas de entrega se relacionan en el anexo 43 del informe técnico del trimestral 9.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA**.

A.4.2.4. Dotación con material pedagógico que permita fortalecer las instituciones educativas y procesos de formación implementadas en los ETCR Charras y Colinas.

Teniendo en cuenta el diagnóstico desarrollado de manera participativa con la comunidad de los Espacios Territoriales Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día, el proyecto Amazonía Joven a través de Hilfswerk Internacional, realizó la dotación con materiales e insumos pedagógicos, que tienen por objetivo fortalecer el proceso de enseñanza que se realiza al interior de los espacios. Generando de esta manera una capacidad instalada, que incentive a la Población en Proceso de Reincorporación (PPR), a acceder a programas de formación, contando con herramientas mínimas para desarrollar estos procesos.

A continuación, se relaciona los implementos entregados por cada ETCR:

❖ **Dotación ETCR Jaime Pardo Leal, vereda COLINAS. 23 de diciembre 2020.**

ELEMENTO	CANTIDA
Silla universitaria color blanco, con pupitre para apoyar. (Material plástico).	40
Mapamundi físico y político. (Pliego de 70x100)	6
Mapa del Departamento del Guaviare (Pliego de 70x100)	1
Tablero Acrílico Liso 120cm X 240 Cm Perfil En Aluminio	2
Tablero Acrílico 1.64x123cm Cuadrulado Con Trípode.	6
Escritorios para computador sencillo. Largo 1.20, Ancho 40 cm, base en lámina de madera.	12
Silla para escritorio en plástico.	14
Extensión eléctrica 10 metros	2
Juegos de mesa- didácticos (Yenga, rompecabezas, ajedrez, lotería, cartas de póker, domino, uno, parques, naípe, twister)	10
Borrador de tablero acrílico	6
Caja de marcadores borrables para tablero acrílico X12	1
Resma de papel tamaño carta	10
Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, blanco, negro)	5
Tablas para asistencia en plástico	3
Rollo papel Kraft 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts	1
Rollo de papel periódico de 100 metros, ancho 70 cms.	1
Mapa Mundo (globo terráqueo) tamaño 20 cm, rotación 90 ° base de plástico material del globo plástico.	2
Piso Fomi para Pre-escolar y primaria 26 fichas en temática de letras, números y animales. 29cm x 29cm	3
Estante mediano en plástico con 3 pisos y 4 cajones horizontales	3
Pelotas en diferentes tamaños en caucho (grandes, medianos y pequeños)	15
Isabel Allende- La ninfa de porcelana	1

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Pablo Neruda- Veinte poemas de amor y una canción desesperada	1
Gabriel García Márquez- Crónica de una muerte anunciada	1
Alejo Carpentier- Los pasos perdidos	1
Mario Vargas Llosa-El estallido del populismo	1
Junot Díaz-La maravillosa vida breve de Óscar Wao	1
Roberto Bolaño-Amberes	1
Jorge Volpi- Una novela Criminal	1
Roberto Arlt-Viaje Terrible	1
Ernesto Sábato-Antes del fin	1
Jorge Luis Borges- El Aleph	1
Juan Rulfo- Pedro Paramo	1
Federico García Lorca-La Casa de Bernarda Alba	1
Leandro Fernández Moratín- El viejo y la niña	1
Miguel de Cervantes-Don Quijote de la Mancha	1
Diccionario ingles español	1
- Ciencia para niños Vesna Kartal, Dragoslava Gunjic. Jimmy Liao-Yo soy perfecta. - Cuentos para niñas y niños felices Álex Rovira, Francesc Miralles hola, rabia Álvaro Robledo C. - El monstruo que le gustaba leer- Lili Chartrand.	1
Miguel Cerro-Después de la lluvia	1
Horacio Quiroga- cuentos de la selva	1
Judith Anderson- Milagros de la naturaleza, había una vez una semilla.	1
Susanna Isern-Cartas en el Bosque.	1
María Quintana Silva- El último árbol	1
Libro de mitos y leyendas colombianas	1
Cuentos ilustrados de Rafael Pombo.	1
Fabulas Esopo	1
La gallina de los huevos de oro	1
Antoine de Saint- El precipito.	1
Escritorio de triángulo con silla para niño de preescolar	6



Dotación pedagógica entregada al ETCR Jaime Pardo Leal.

❖ **Dotación ETCR Marco Aurelio Buen Día, vereda Charras. 17 de diciembre 2020.**

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

ELEMENTO	CANTIDAD
Silla universitaria color blanco, con pupitre para apoyar. (Material plástico).	40
Mapa de Colombia (Pliego de 70X 100):	2
Mapamundi físico y político. (Pliego de 70x100)	2
Mapa del Departamento del Guaviare (Pliego de 70x100)	1
Tablero Acrílico 1.64x123cm Cuadrulado Con Trípode.	3
Escritorios para computador sencillo Largo 1.20 m. Ancho 40 cm, base en lamina de madera.	12
Silla para escritorio en plástico.	14
Extensión eléctrica 10 metros	3
Juegos de mesa- didácticos (Yenga, rompecabezas, ajedrez, lotería, cartas de póker, domino, uno, parques, naipes, twister)	10
Borrador de tablero acrílico	3
Caja de marcadores borrables para tablero acrílico X12	1
Resma de papel tamaño carta	10
Vinilos grandes (amarillo, azul, rojo, blanco, negro)	5
Tablas para asistencia en plástico	3
Rollo papel Kraft 91 CM (36 Pulgadas) x 8 Kilos - 60 Gramos - 150 mts	1
Rollo de papel periódico de 100 metros, ancho 70 cms.	1
Mapa Mundo (globo terráqueo) tamaño 20 cm, rotación 90 ° base de plástico material del globo plástico.	2
Estante mediano en plástico con 3 pisos y 4 cajones horizontales	3
Laboratorio de química estándar	1



Dotación pedagógica entregada al ETCR Marco Aurelio Buen Día.

1. El día 15 de marzo de 2021, se realizó una nueva entrega de dotación pedagógica, en la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía-Charras, con la cual, se pretende fomentar el arte de las pinturas en las nuevas generaciones. La dotación está compuesta por acuarelas, pinturas en óleo, lienzos, caballetes y pinceles.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



1. El día 17 de marzo de 2021, se realizó la entrega de la dotación pedagógica, artística y tecnológica al Espacio Territorial Jaime Pardo Leal de la vereda Colinas, con la cual se pretende fortalecer el proceso de formación educativo que se viene desarrollando al interior del espacio, tanto en jóvenes como en adultos. La dotación entregada fue la siguiente:

- 1 televisor de 55 pulgadas curvo.
- 1 impresora multifuncional.
- 1 cabina de sonido.
- 8 ups.
- 1 video Beam.
- 1 telón de proyección.
- 4 caballetes para pintar.
- 6 lienzos con acuarelas, set de pinceles, oleos y acrílicos.



Entrega dotación pedagógica, artística y tecnológica ETCR Jaime Pardo Leal.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA.**

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

A.4.3. Fortalecimiento del proceso de reincorporación y construcción de tejido social, mediante diálogos de saberes y resignificación cultural de las comunidades indígenas de los ETCR Charras y Colinas.

A.4.3.1. Fomentar la cultura propia y realización de Dos (2) Encuentros interculturales que permitan fortalecer la ruta de reincorporación propia de las comunidades indígenas pertenecientes a los ETCR.

Para dar cumplimiento a esta actividad, se desarrollaron dos encuentros:

1. ***Encuentro de revitalización cultural alrededor de la gastronomía tradicional***, el cual tuvo por objetivo recordar los usos y costumbres ancestrales para la transformación, preparación y almacenamiento de alimentos propios, especialmente en la elaboración de fariña y casabe a partir de la yuca brava. El encuentro se desarrolló los días 27 y 28 de junio de 2020, en el ETCR Jaime pardo Leal de Colinas, donde participaron 35 personas, todas pertenecientes al Espacio Territorial. Para mayor información, remitirse a los anexos 48,49 y 50 del informe técnico correspondiente al 8 trimestre.
2. Encuentro ***Reconociendo la diversidad cultural de mi pueblo***, el cual se desarrolló el día 19 de septiembre de 2020, en el ETCR Jaime Pardo Leal de la vereda colinas. Este importante encuentro contó con la participación de 12 reincorporados del espacio territorial Marco Aurelio Buen Día de Charras, así como 180 personas, mayoritariamente adultas del espacio territorial Colinas. Para mayor información, remitirse al anexo 71 del informe técnico correspondiente al 8 Trimestre.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA.**

A.4.3.2. Conformación de dos (1 charras, 1 colinas) escuelas culturales y deportivas con las comunidades de los ETCR Colinas y Charras.

Con el desarrollo de las sesiones implementadas por el proyecto Amazonía Joven, desde el mes de marzo el año 2019 y hasta el mes de noviembre del año 2020, se dan por terminadas las escuelas de formación cultural y deportivas, desarrolladas en los Espacios territoriales de Capacitación y Reincorporación, Jaime Pardo Leal y Marco Aurelio Buen Día. Cabe destacar, que los impactos de estos procesos de formación son innumerables, los mismos que en cada clase eran reflejados por los jóvenes participantes, quienes manifestaban que, entre sus sueños, no estaba la posibilidad de tener entornos culturales y deportivos por el difícil acceso de las vías, el abandono institucional y por la línea imaginaria que tiene el campo y la ciudad, por culpa de una guerra que los volvía invisibles para la sociedad. Los impactos sociales quizás son difíciles de cuantificar, sin embargo, estrechar la mano de indígenas, campesinos y excombatientes e iniciar a escribir una nueva historia, son los resultados de cada intercambio cultural desarrollado en estas comunidades. Dentro de los resultados generados con las escuelas de formación se pueden citar los siguientes:

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

- 167 personas vinculadas en las escuelas de formación, de los cuales 105 pertenecieron a las escuelas deportivas (**20 indígenas Nukak, 20 indígenas Sikuani y 65 habitantes del ETCR Marco Aurelio Buen Día**) y 62 pertenecieron a las escuelas de formación cultural (**15 jóvenes que hacen parte de las danzas folclóricas y 47 habitantes del ETCR Jaime pardo Leal, que participaron en las sesiones de bailoterapia**). De los 167 participantes 80 son hombres, 87 mujeres, 94 jóvenes, 54 reincorporados, 74 indígenas y 14 afros.
- Apertura de espacios de dialogo y reconciliación entre comunidades indígenas, campesinas y excombatientes, utilizando como medio un lenguaje universal, como lo es el arte y el deporte.
- Conocimiento y reconocimiento de las expresiones culturales que hay en el territorio, especialmente de las comunidades indígenas (baile, artesanías, música, instrumentos musicales).
- Ocupación del tiempo libre.
- Empoderamiento cultural por parte de los participantes.
- Generación de habilidades artísticas y deportivas en los jóvenes.
- Contribución a mantener un estado de salud optimo, mediante la ejercitación en las diferentes actividades de entrenamiento físico.
- Resiliencia, reconciliación y convivencia a nivel comunitario, liderado por los jóvenes.



Escuelas de formación cultural.

Para mayor información de esta actividad, en el anexo 51 del informe técnico correspondiente al trimestre 7, se encuentra la base de datos de la población atendida.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA.**

A.4.3.3. Desarrollo de cinco (5) encuentros Interculturales de música, danza y deporte, con la participación activa de los miembros de los ETCR Colinas y Charras, que visibilicen

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

adicionalmente el trabajo de las escuelas culturales y deportivas, promueva su sostenibilidad futura

1. El día 07 de noviembre de 2020 en el Espacio Territorial Jaime Pardo Leal de la vereda Colinas, se llevó a cabo el encuentro comunitario denominado **CONSTRUYENDO TEJIDO SOCIAL PARA FORTALECER LOS VINCULOS FAMILIARES DE LA POBLACION EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN**. El objetivo del encuentro, fue generar espacios de integración y dialogo al interior de la comunidad, mediante la celebración del Día del Niño.
2. El día 07 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el segundo encuentro intercultural de música danza y deporte, denominado **FERIA DE TALENTOS**, el cual, se desarrolló en el Espacio Territorial Jaime Pardo Leal de la vereda Colinas, con una participación de más de 150 personas, entre niños, niñas, jóvenes y adultos que habitan el Espacio Territorial. Es necesario mencionar que se seleccionó el día 07 de diciembre, ya que la comunidad manifestó, que para ellos el día de las velitas era un día muy simbólico en su niñez, pero cuando estaban en las FARC, este tipo de celebraciones no se realizaban, por ende, quisieron revivir esta fecha tan especial y compartirla en familia.
2. solicitud expresa del Espacio Territorial Marco Aurelio Buen Día y la vereda Charras al proyecto Amazonía Joven, el día 30 de diciembre de 2020 se apoyó económica y logísticamente, el desarrollo de un campeonato deportivo a nivel veredal, en donde participaron equipos de futbol masculino y femenino del ETCR, de la comunidad Nukak y jóvenes de la vereda, quienes anualmente y como forma de despedir el año, se reúnen y desarrollan actividades deportivas. Esta estrategia permite generar espacios de dialogo, ocupación del tiempo libre y generar hábitos de vida saludable.
3. El día 08 de marzo se desarrolló en el ETCR Jaime Pardo Leal de la vereda Colinas, el cuarto (4) encuentro intercultural de música y danza, con motivo de conmemorar el día internacional de la mujer, denominado **“RESIGNIFICACIÓN DEL ROL DE LA MUJER RURAL”**, cuyo objetivo, fue la resignificación de la labor de la mujer rural en el desarrollo territorial y la consolidación de una cultura de paz. El evento contó con la participación de 100 personas todos miembros del Espacio Territorial Colinas.
4. El día 15 de marzo de 2021, se realizó en la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buen Día, el quinto (5) encuentro intercultural de música y danza, con motivo de la conmemoración del día internacional de la mujer, denominado **“RESIGNIFICACIÓN DEL ROL DE LA MUJER RURAL”**, cuyo objetivo, fue la resignificación de la labor de la mujer rural en el desarrollo territorial y la consolidación de una cultura de paz. El evento se desarrolló desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. y conto con la participación de 120 personas entre miembros del ETCR y mujeres de la vereda Charras, que fueron invitadas.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

Con el desarrollo de los 5 encuentros interculturales de música, danza y deporte estipulados en el OPA, se da por cumplida la actividad.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA.**

A.4.3.4. Dotación artística y deportivas para las escuelas de formación ubicadas en los ETCR Colinas y Charras.

La organización Hilfswerk Internacional en representación del Proyecto Amazonía Joven, realizó la entrega de dotación deportiva, con el fin de generar capacidad instalada y fomentar hábitos y estilos de vida saludable a través de la actividad física. Basados en lo acordado con cada ETCR, se realizó la entrega de los elementos necesarios para la instalación de un gimnasio de cardio, que les permita a hombres y mujeres, tonificar músculos, quemar grasas y realizar ejercicios cardiovasculares. En este sentido, cada ETCR quedo con un gimnasio instalado.



Entrega elementos deportivos ETCR Marco Jaime pardo Leal Colinas



Instalación de Gimnasio ETCR Marco Aurelio Buen Día Charras

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.**

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

Teniendo en cuenta un excedente presupuestal en la línea de dotación deportiva y artística, se realizó una reunión de concertación con la directiva del ETCR Marco Aurelio Buen Día, en donde se priorizó fortalecer el proceso de formación de música que se viene adelantando con el SENA, en donde niños, niñas y jóvenes, reciben clases presenciales para adquirir habilidades en el manejo de instrumentos musicales. En este orden de ideas, a través del proyecto Amazonía Joven, se realizó la dotación de instrumentos musicales de la región llanera (Arpa, Maracas, Cuatro, Bajo, requinto, entre otros), que le permitan a las nuevas generaciones adquirir habilidades artísticas y ocupar el tiempo libre.



Entrega de instrumentos musicales como parte de la dotación artística

Esta actividad se considera **CUMPLIDA**.

A.4.4 Construcción y/o remodelación de pequeña infraestructura educativa, comunitaria, productiva y/o turística.

A.4.4.1. Diagnóstico de las necesidades identificadas y elaboración de diseños de manera participativa con la comunidad de los ETCR Charras y Colinas.

En total se proyectaron 11 obras que corresponden a las líneas educativa, socio comunitaria y productiva, a cada una de las cuales se les elaboró un diagnóstico y diseño de manera concertada con las comunidades beneficiadas. De las 11 obras priorizadas para los Espacios Territoriales, 7 corresponden al ETCR Colinas y 4 al ETCR Charras.

ETCR Colinas

- a) Mejoramiento de 2 aulas en la escuela nueva generación.
- b) Adecuación de aula virtual.
- c) Adecuación de Gimnasio.
- d) Mejoramiento puesto de salud.
- e) Construcción caseta de transformación de productos étnicos.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

- f) Construcción taller de confecciones.
- g) Construcción sistema de almacenamiento 10.000 lts de agua para centro de acopio.

ETCR Charras

- a) Adecuación de aula virtual.
- b) Adecuación de Gimnasio.
- c) Adecuación sastrería.
- d) Adecuación planta para la producción de lácteos.

Para mayor información, en el Anexo 48 del informe correspondiente al décimo (10) trimestre, se relaciona el Diagnostico de las infraestructuras de los Espacios territoriales. En el caso puntual del centro de salud del ETCR Colinas, el cual se va realizar como infraestructura nueva, se realizaron los diseños y planos según las recomendaciones hechas por la Secretaría de Salud Departamental y la exigencia del Gobierno nacional.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA.**

A.4.4.2. Jornadas de trabajo comunitario

Informe 12 final.

Espacio territorial Jaime Pardo Leal de Colinas.

1. Construcción de sistema de almacenamiento de 10.000lts de agua:

Actividad desarrollada durante el mes de agosto:

- Instalación de sistema de torre de aireación, con 4 bandejas en acero inoxidable trapezoidales de 50x 50cm y fondo de 30x30cm.



Actividad: Torre de aireación



Actividad: Instalación sistema de tratamiento

Anexo 7. Acta de entrega torre de aireación.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

2. Caseta de transformación de productos étnicos:

El día 23 de agosto de 2021, se realizó una jornada de trabajo comunitario para la terminación de las actividades de obra en la caseta de transformación de productos étnicos, , en el cual, se desarrollaron las siguientes actividades de obra:

- Enchape de mesón y muro cocina
- Aplicación de Barniz en bloque #4 a la vista interno
- Estuco columnas



Actividad: Enchape de cocina e instalación lavaplatos

Anexo 8. Listado de asistencia jornada de trabajo No 23.

Espacio territorial Marco Aurelio Buendía

1. Construcción tienda comunitaria en la vereda Boquerón:

Durante el mes de agosto, la comunidad beneficiada continuó con las actividades de obra, para la construcción de la tienda comunitaria Marco Aurelio Buendía, desarrollando las siguientes actividades:

- Mampostería, pega de bloque # 4
- Columnas en concreto 3000 psi
- Pañete muros internos y externos
- Viga de amarre 20 x 25cm
- Muro cuchilla
- Excavación pozo séptico
- Construcción placa piso en concreto.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

	
Actividad: Columnas en concreto	Actividad: Mampostería
	
Actividad: Pañete muros	Actividad: infraestructura local

Anexo 9. Informe de avance de obra. Tienda comunitaria.

Es necesario mencionar que, la obra denominada Tienda Comunitaria Marco Aurelio Buen Día, continua en desarrollo debido a la ausencia de materiales que debe entregar el socio FAO y lo acordado con la directora nacional del proyecto, es que, a partir del mes de septiembre, la organización FAO asume el seguimiento, debido a la culminación del OPA firmado con Hilfswerk. El resto de las obras relacionadas en la presente actividad (*sistema de almacenamiento de agua y caseta para la transformación de productos étnicos*) ya se encuentran culminados y fueron entregados de manera formal a la comunidad.

En este orden de ideas, las actividades de seguimiento y entrega de materiales a cargo de Hilfswerk, fueron realizadas en su totalidad, por ende, la presente actividad se considera cumplida.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA**.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

A.4.4.3. Obras construidas y/o remodeladas.

Informe 12 final.

1. Aclaración sobre la modificación de la obra del puesto de salud.

A través de un proceso de socialización y concertación con líderes del Espacio Territorial Jaime Pardo Leal, entidades del orden municipal y departamental, misión de verificación de la ONU, ARN, E.S.E de primer nivel y organismos de cooperación internacional, desde el mes de agosto del año 2020, se trabajó articuladamente para apoyar el Mejoramiento de las instalaciones del puesto de salud en el ETCR Jaime Pardo Leal de la vereda Las Colinas. Se realizaron los diseños arquitectónicos cumpliendo con la normatividad para la prestación del servicio médico, además, se realizaron **compromisos** para sacar esta iniciativa adelante, con aportes en materiales (Misión de verificación de la ONU, proyecto Amazonía Joven) y en recursos para mano de obra (Gobernación del Guaviare). Sin embargo y aunque la Gobernación del Guaviare había comprometido su participación a través de la financiación de la mano de obra, finalmente y una vez ONU Y Hilfswerk habían adquirido los materiales para la construcción, manifestaron que, por temas administrativos, la Gobernación no podía realizar el desembolso de los recursos de mano de obra.

En este orden de ideas y con el ánimo de utilizar adecuadamente los materiales adquiridos, que permitieran beneficiar a la comunidad en proceso de reincorporación, a nivel de proyecto (FAO – Hilfswerk), se acordó concertar con la junta del ETCR Colinas, la priorización de una obra que representara los intereses de toda la comunidad. En este sentido el día 28 de agosto de 2021, se realizó reunión con los líderes del ETCR, con el fin de revisar el estado de los materiales entregados a través de Hilfswerk y concretar otra iniciativa que se pudiera apoyar. Se concluyó, que una de las iniciativas de interés general y que cuentan con recurso para la mano de obra, es la construcción de la tienda comunitaria, por lo tanto, en esta reunión, los líderes del ETCR acordaron que los materiales que estaban destinadas al puesto de salud, fueran redireccionados a la ampliación de la tienda comunitaria de Colinas.

Anexo 10. Acta de concertación puesto de salud.

2. Sistema de almacenamiento de agua

El día 28 de agosto de 2021 se realizó entrega de la obra Construcción de sistema de almacenamiento de 10.000 litros de agua, de este sistema se abastecerán de agua potable tres infraestructuras que se encuentran en construcción en este predio: Centro de acopio, planta de transformación y Restaurante. Una vez se encuentre en funcionamiento una de las construcciones, se subirán los tanques a la estructura de almacenamiento.

OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019



Sistema de almacenamiento y distribución de agua, ETCR Colinas.

Anexo 11. Acta de entrega sistema de almacenamiento.

3. Caseta de transformación de productos étnicos

El día 28 de agosto de 2021, se realizó la entrega de la obra de infraestructura denominada **“Caseta para la transformación de productos étnicos”** en el ETCR Jaime Pardo Leal de la vereda Colinas. La cual, se constituye como un espacio autónomo para que la población indígena en proceso de reincorporación, pueda desarrollar sus costumbres gastronómica y generar valor agregado a la materia prima que se produce en la chagra.



Actividad: Entrega de Caseta de transformación

Anexo 12. Acta de entrega caseta de transformación de productos étnicos.

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

4. Tienda comunitaria Marco Aurelio Buendía

El día 30 de agosto de 2021, se realizó la entrega parcial de la obra denominada, **Tienda comunitaria Marco Aurelio Buendía**, la cual, se está construyendo en el nuevo predio ubicado en la vereda boquerón. En el momento de la entrega, la obra presenta un porcentaje de avance del 55% en las actividades de obra. Esta obra que beneficiará a la comunidad noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, contará con un local para la comercialización de productos alimenticios, farmacia, Bodega y batería sanitaria. Es necesario aclarar, que faltan algunos materiales como la cubierta (tejas) que serán entregados por el socio FAO.



Entrega parcial de obra. Tienda comunitaria Boquerón.

Anexo 13. Acta de entrega parcial, tienda comunitaria Boquerón.

A continuación, se relaciona un cuadro en el que se detallan las obras comunitarias, educativas y/o productivas que se realizaron o están desarrollando con la Población en Proceso de Reincorporación (PPR), en el marco del Resultado 4 (R4) del proyecto Amazonía Joven.

Resultado	Nombre de la obra	Ubicación	línea	Tiempo de ejecución	valor total	Estado
R.4	Construcción de Taller de confecciones	ETCR Colinas	Infraestructura Productiva	45 días	\$ 27.021.800	Realizada
	Construcción de sistema de almacenamiento de 10.000 lts de agua	ETCR Colinas	Infraestructura Productiva	45 días	\$ 19.152.100	Realizada
	Construcción de caseta de transformación de productos étnicos	ETCR Colinas	Infraestructura Productiva	60 días	\$ 31.583.000	Realizada
	Mejoramiento de 1 Aula en la escuela nueva generación	ETCR Colinas	Infraestructura Educativa	60 días	\$ 21.000.000	Realizada
	Mejoramiento de 1 Aula en la escuela nueva generación- Articulado con FAO	ETCR Colinas	Infraestructura Educativa	60 días	\$ 12.000.000	Realizada

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.
PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019**

Construcción de Tienda comunitaria	ETCR Colinas	Infraestructur a Productiva	90 días	\$ 62.538.900	En ejecución
Adecuación Aula virtual	ETCR Colinas	Infraestructur a Educativa	30 días	\$ 4.000.000	Realizada
Adecuación Gimnasio	ETCR Colinas	Infraestructur a Comunitaria	30 días	\$ 4.852.250	En ejecución
Adecuación Aula virtual	ETCR Charras	Infraestructur a Educativa	30 días	\$ 4.368.100	Realizada
Adecuación Gimnasio	ETCR Charras	Infraestructur a Comunitaria	30 días	\$ 4.852.250	Realizada
Adecuación taller de confecciones	ETCR Charras	Infraestructur a Productiva	30 días	\$ 8.000.000	Realizada
Construcción tienda comunitaria	ETCR Charras	Infraestructur a Productiva	90 días	\$ 51.420.800	En ejecución

En este orden de ideas, las actividades de seguimiento y entrega de materiales a cargo de Hilfswerk, fueron realizadas en su totalidad, por ende, la presente actividad se considera cumplida.

Esta actividad se considera **CUMPLIDA**.

A continuación, y con el ánimo de facilitar el seguimiento técnico del socio FAO, se detallan las obras de los ETCR que se encuentran en desarrollo, con las actividades que se han realizado a corte de 31 de agosto de 2021, y las actividades pendientes por desarrollar.

NOMBRE	UBICACIÓN	ESTADO % DE AVANCE	ACTIVIDAD POR DESARROLLAR
Construcción Tienda comunitaria Marco Aurelio Buendía	vereda Boquerón	Avance de obra 55% Actividades desarrolladas • Cimentación • Columnas en concreto • Viga de amarre en concreto • Placa piso en concreto • Mampostería • Pañete	• Instalación estructura metálica para cubierta • Instalación cubierta • Pañete muro fachada • Filos y dilataciones • Instalación puertas • Instalación ventanas • Estuco • Pintura • Instalación cerámica piso • Instalación cerámica baño • Andenes • Instalación sanitario • Instalación tanque prefabricado • Instalación cielo raso • Conexión acometida eléctrica • Conexión acueducto

**OBSERVACIONES A INFORME TÉCNICO PRESENTADO POR HWI EN RELACION CON EL OPA FIRMADO
CON FAO EL 22/10/2018.**

PERIODO DEL 01/08/2019 AL 31/10/2019

Adecuación gimnasio	Espacio Territorial Jaime Pardo Leal	Avance de obra 95% Actividades desarrolladas • Cubierta en teja de zinc • Mampostería a la vista • Placa piso en concreto	• Instalación puertas • Instalación tapete negro
Construcción tienda comunitaria	Espacio Territorial Jaime Pardo Leal	Avance de obra 5% Actividades desarrolladas • Nivelación de terreno	• Cimentación • Columnas en concreto • Viga de amarre • Placa piso en concreto • Mampostería en bloque #4 y ladrillo helio a la vista en fachada. • Pañete muros internos y externos • Instalación estructura metálica para cubierta • Instalación cubierta • Filos y dilataciones • Instalación puntos eléctricos para tomacorrientes, lámparas e interruptores. • Instalación puertas metálicas • Instalación puertas en vidrio para fachada • Instalación ventanas • Estuco listo en muros internos • Pintura a 3 manos • Instalación cerámica piso
